

**Отчет о деятельности
КГКУ "Единый стройзаказчик"
за 2018 год**

1. Общие сведения об Учреждении

Краевое государственное казенное учреждение «Единый заказчик капитального строительства Алтайского края» было создано постановлением Администрации Алтайского края от 18.12.2014 № 559 в целях оптимизации управления строительной отраслью в крае.

Основная цель деятельности Учреждения – осуществление закупок для государственных нужд Алтайского края в сфере проектирования, ремонта, реконструкции, строительства объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета.

Юридический адрес: 656043, г. Барнаул, ул. Никитина, д. 78.

Электронный адрес: office@ez22.ru

Сайт: www.ez22.ru.

Руководитель учреждения – директор Котельников Александр Михайлович.



2. Деятельность отдела юридического, кадрового и общего обеспечения.

По состоянию на 31.12.2018 года Учреждение укомплектовано штатами на 98,5%, штатная численность составляет 65 единиц при предельной численности 66 единиц. Коэффициент текучести кадров составил 29,7 %.

В 2018 году большое значение Учреждением было уделено повышению квалификации работников. Курсы повышения квалификации прошли:

7 работников - по программе «Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд»;

11 работников – по программе «Безопасность строительства и осуществление строительного контроля».

В 2018 году значительно увеличился объем документооборота в Учреждении.

В таблице приведены показатели входящей и исходящей документации в 2017-18 годах, которые демонстрируют существенный рост ее количества в рассматриваемом периоде.

	2017	2018	Рост (%)
Исходящая документация	2711 единиц	5344 единиц	97%
Входящая документация	2661 единиц	5415 единиц	103%



По итогам 2018 года в рамках текущей деятельности Учреждения отделом юридического, кадрового и общего обеспечения принято участие в рассмотрении 12 жалоб участников закупок на действия заказчика, уполномоченного учреждения, поступивших в УФАС по Алтайскому краю. По результатам рассмотрения жалоб лишь 3 из них признаны обоснованными.

В связи с ненадлежащим исполнением условий государственных контрактов и принятием государственным заказчиком решения об одностороннем отказе от их исполнения в УФАС по Алтайскому краю направлена информация о включении в реестр недобросовестных поставщиков в отношении трех подрядных организаций по пяти государственным контрактам, из них:

- принято решение о включении в реестр в отношении одного подрядчика, по трем государственным контрактам;
- отказано во включении в реестр в отношении одного подрядчика;
- в отношении одного подрядчика рассмотрение информации о включении в реестр отложено до принятия решения Арбитражным судом Алтайского края.

В рамках претензионной работы, в целях урегулирования споров, в адрес контрагентов направлено 10 претензий и требований, из них в досудебном порядке исполнено – 5, в том числе две о взыскании в бюджет Алтайского края неосновательного обогащения на сумму 493,9 тыс. рублей, три об уплате по банковской гарантии на сумму на сумму 103,0 тыс. рублей.

В 2018 году на рассмотрении Арбитражного суда Алтайского находилось 18 дел, из них: 14 – гражданские, 1 – банкротное, 3 – административные, по которым Учреждение выступало в качестве истца – 7, ответчика – 8, третьего лица – 3.

Рассмотрение трех дел Арбитражным судом окончено, решения вступили в законную силу, из них: 2 – по иску Учреждения (иски удовлетворены полностью), 1 – по иску поставщика (в удовлетворении иска отказано полностью). Рассмотрение 15 дел по существу не окончено, судебные решения не приняты.

В рамках деятельности Учреждения по применению к поставщикам (подрядчика, исполнителям) неустойки за просрочку исполнения принятых на себя обязательств во внесудебном порядке взысканы пени в размере 5 234,6 тыс. рублей. Указанная сумма перечислена в доход Алтайского края.

При осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение государственной регистрации права собственности Алтайского края на объекты недвижимости и их кадастрового учета в 2018 году, отделом совершено 12 регистрационных действий.

3. Деятельность отдела бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

В соответствии с приказом Минстройтранса Алтайского края о наделении полномочий администраторов доходов краевого бюджета, учреждением за 2018 год перечислено по возмещению в бюджет Алтайского края доходов на сумму 7 095,8 тыс. рублей по следующим статьям:

Наименование показателя	2018 г.
Доходы	7 095,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	2 728,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг	149,3
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	4 217,8

Законом Алтайского края от 05.12.2017 №92-ЗС «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» Учреждению доведены

КГКУ «Единый стройзаказчик»

лимиты бюджетных обязательств в сумме 44 722,0 тыс. рублей, освоено денежных средств в сумме 40 154,8 тыс. рублей, что составило 90% от плановых назначений.

Анализ расходов учреждения представлен в виде таблицы и структуры.


Наименование показателя	2018 г.	
	тыс. руб.	удельный вес, %
Расходы	40 154,8	100 %
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	34 862,8	86,8 %
Коммунальные расходы	466,4	1,1 %
Услуги связи	268,9	0,7 %
Прочие расходы	4 031,2	10,1 %
Налоги (имущество, земельный, транспортный)	525,5	1,3 %

4. Осуществление функций государственного заказчика.

В целях реализации краевой адресной инвестиционной программы на 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 20.12.2018 № 469, КГКУ «Единый стройзаказчик» выполняло функции государственного заказчика в отношении 79 объектов капитального строительства, в том числе объектов: образования – 13, здравоохранения – 46, культуры – 10, физической культуры и спорта – 2, социального обеспечения – 1, жилищного строительства – 1, жилищно-коммунального хозяйства – 1, прочих – 5.

В таблице приведен сравнительный анализ по количеству объектов, закрепленных за Учреждением в 2017 и 2018 гг.

2017		2018		Рост (%)
Всего 56		Всего 79		
Объекты образования	7	Объекты образования	13	85 %
Объекты здравоохранения	37	Объекты здравоохранения	46	24 %
Объекты физической культуры и спорта	2	Объекты физической культуры	2	0 %
Объекты культуры	3	Объекты культуры	10	233%
Объекты социального обеспечения	0	Объекты социального обеспечения	1	100%
Объекты жилищного строительства	1	Объекты жилищного строительства	1	-
Объекты ЖКХ	2	Объекты ЖКХ	1	-
Прочие объекты	4	Прочие объекты	5	25 %

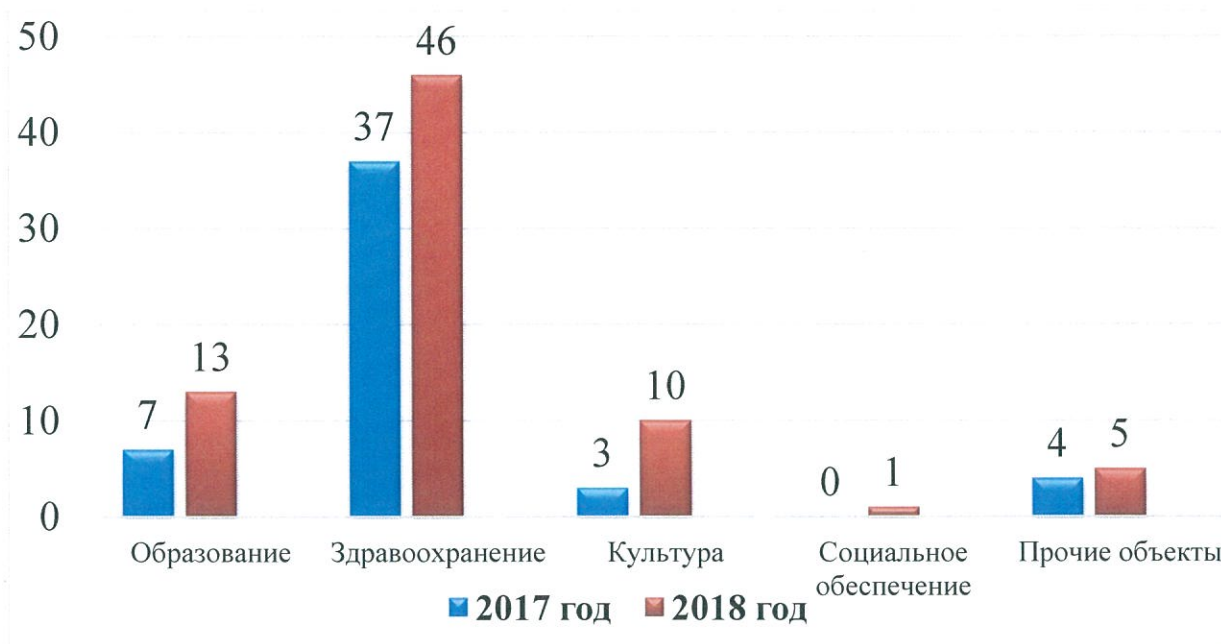

Прослеживается значительное увеличение количества объектов, на которых Учреждение выступает государственным заказчиком.

20 объектов из 79 входят в Губернаторскую программу «80х80», 9 в программу «85х85».

Общий объем израсходованных средств на реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной программы в 2018 году составил 1 163,77 млн. рублей, в том числе средств краевого бюджета – 894,8 млн. рублей, средств федерального бюджета – 195,56 млн. рублей и средств Пенсионного фонда Российской Федерации – 73,41 млн. рублей. Объем освоённых средств в 2018 году превышает аналогичный показатель 2017 года в 1,8 раза.

Общий процент освоения денежных средств, выделенных на объекты в 2018 году за счет всех источников финансирования составил 77,4%.



5. Деятельность Учреждения в области проектирования.

Выполняя функции технического заказчика, КГКУ «Единый стройзаказчик» 2018 году заключено 36 государственных контрактов на проектирование новых объектов.

По 9 объектам получены положительные заключения КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края»:

- «г. Барнаул, реконструкция здания КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края», расположенного по адресу: просп. Ленина, д. 88 / просп. Калинина, д. 1. Завершение реконструкции»;

- «Алтайский район, с. Алтайское, строительство зданий больничного комплекса КГБУЗ «Алтайская центральная районная больница»;

- «г.Рубцовск, строительство многофункциональной ледовой арены»;

- «г.Новоалтайск, строительство детского ясли-сада на 280 мест»;

- «Каменский район, г.Камень-на-Оби, строительство детского ясли-сада на 200 мест»;

- «Первомайский район, пос. Сибирский строительство детского ясли-сада на 140 мест»;

- «Волчихинский район, с. Усть-Волчиха, строительство средней образовательной школы на 140 учащихся (для повторного применения на территории Алтайского края)»;

- «г.Барнаул, строительство наружных сетей центра медицинской реабилитации ортопедо-травмотологического профиля (теплоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение). 2 этап»;

- «г. Барнаул, строительство административного здания, расположенного по адресу: ул. Взлетная, д. 2ж» (повторная государственная экспертиза).

В 2018 передана на государственную экспертизу проектная документация по 8 объектам:

- «Тальменский район, с. Ларичиха, строительство средней общеобразовательной школы»;

- «г. Новоалтайск, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся, расположенной по адресу: ул. Индустриальная, д. 2/1»;

- «г. Барнаул, строительство поликлиники в квартале 2002а»;

- «г. Барнаул, реконструкция здания КГБ ПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж», расположенного по адресу: ул. Песчаная, д. 84»;

- «г. Барнаул, реконструкция (пристройка перехода) КГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 7, г. Барнаул»;

- «Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, строительство культурно-спортивного центра»;

- «г. Барнаул, реконструкция корпуса центра амбулаторного гемодиализа КГБУЗ «Краевая клиническая больница», расположенного по

адресу: ул. Ляпидевского, д. 1к, под размещение центра термических поражений»;

- «Ребрихинский район, с. Ребриха, строительство поликлиники на 210 посещений в смену (для повторного применения на территории Алтайского края).

Получены положительные заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства КАУ «Алтайский региональный центр ценообразования в строительстве» по 23 объектам:

- 9 заключений по проектам повторного применения для строительства фельдшерско-акушерских пунктов в следующих населенных пунктах Алтайского края:

- Залесовский район, с. Пещерка;
- Заринский район, с. Новодраченино;
- Ключевский район, с. Зеленая поляна;
- Красногорский район, с. Березовка;
- Завьяловский район, с. Светлое;
- г. Славгород, с. Покровка;
- Новичихинский район, с. Солоновка;
- Тальменский район, с. Зайцево;
- Хабарский район, с. Коротояк.

- 6 заключений на строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в следующих населенных пунктах Алтайского края:

- Алтайский район, с. Куяган
- Павловский район, с. Боровиково
- Павловский район, пос. Озерный
- Топчихинский район, с. Белояровка
- Топчихинский район, с. Зимино
- Чарышский район, с. Тулата.

- 3 положительных заключения по объекту «г. Новоалтайск, реконструкция здания КГКУЗ «Краевая туберкулезная больница № 1», расположенного по адресу: ул. Белоярская, д. 1, под КГБУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер». Ремонтно-восстановительные работы»;

- «г. Бийск, капитальный ремонт крыши здания КГБ ПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж», расположенного по адресу: ул. Льва Толстого, д. 152»;

- «г. Барнаул, капитальный ремонт здания КГБУЗ «Алтайский онкологический диспансер», расположенного по адресу: ул. Матросова, д. 115, под КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул»;

- «Шелаболихинский район, с. Киприно, строительство офиса врачей общей практики»;

- 2 положительных заключения по объекту: «Целинный район, с. Целинное, капитальный ремонт больничного комплекса КГБУЗ «Целинная центральная районная больница».

Передана проектно-сметная документация на проверку в КАУ «Алтайский региональный центр ценообразования в строительстве» и находится на проверке по 2 объектам:

- «г. Заринск, капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Заринск»

- «г. Барнаул, капитальный ремонт здания управления спорта и молодежной политики Алтайского края, расположенного по адресу: ул. Горького, д. 39. Завершение капитального ремонта».

6. Деятельность отдела государственных закупок.

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по итогам 2018 года всего проведено 86 конкурентных процедур на сумму 1 937,73 млн. рублей, из них:

- 18 открытых конкурсов на сумму 65,89 млн. рублей;
- 3 конкурса с ограниченным участием на сумму 623,59 млн. рублей;
- 58 электронных аукционов на сумму 1 245,23 млн. рублей,
- 7 запросов котировок на сумму 3,02 млн. рублей.

Для субъектов малого предпринимательства проведено 45 конкурентных процедур, в том числе в которых установлено требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства проведено 10 процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

По итогам проведения процедур всего заключено 125 контрактов с учетом закупок у единственного поставщика, кроме п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ на сумму 1 690,84 млн. рублей. Экономия, рассчитанная по результатам заключенных контрактов по результатам конкурентных процедур с учетом расторжения и изменения стоимости в 2018 году, составила 280,46 млн. рублей.



7. Пусковые объекты. Объекты отрасли «Здравоохранение»

Капитально отремонтированы 6 объектов здравоохранения, завершена реконструкция 2-х объектов. На эти цели из краевого бюджета в 2018 году израсходовано средств в сумме 75,4 млн. рублей. В рамках реализации государственной программы Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020 годы в 2018 году на строительство фельдшерско-акушерских пунктов из средств федерального бюджета поступило 6,1 млн. рублей.

В 2018 году построены и введены в эксплуатацию 4 фельдшерско-акушерских пункта проектной мощностью - 15 посещений в смену.

1. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Центральная ул., д. 40а, с. Светлое, Завьяловский район.

Общая стоимость строительства составила 3 367,1 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1 390,8 тыс. рублей.

Подрядчик - ООО «МильСтрой-Сибирика».



2. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Школьный пер., д. 4, с. Зеленая Поляна, Ключевский район.

Общая стоимость строительства составила 3 676,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1 546,0 тыс. руб.

Подрядчик - ООО «МильСтрой-Сибирика».



3. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Советская ул., д. 496, с. Березовка, Красногорский район.

Общая стоимость строительства составила 3 826,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1 591,0 тыс. рублей.


Подрядчик - ООО «МильСтрой-Сибирика».



4. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Титова ул., д. 30, с. Покровка, г. Славгород.

Общая стоимость строительства составила 3 720,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1 546,0 тыс. рублей.

Подрядчик - ООО «МильСтрой-Сибирика».

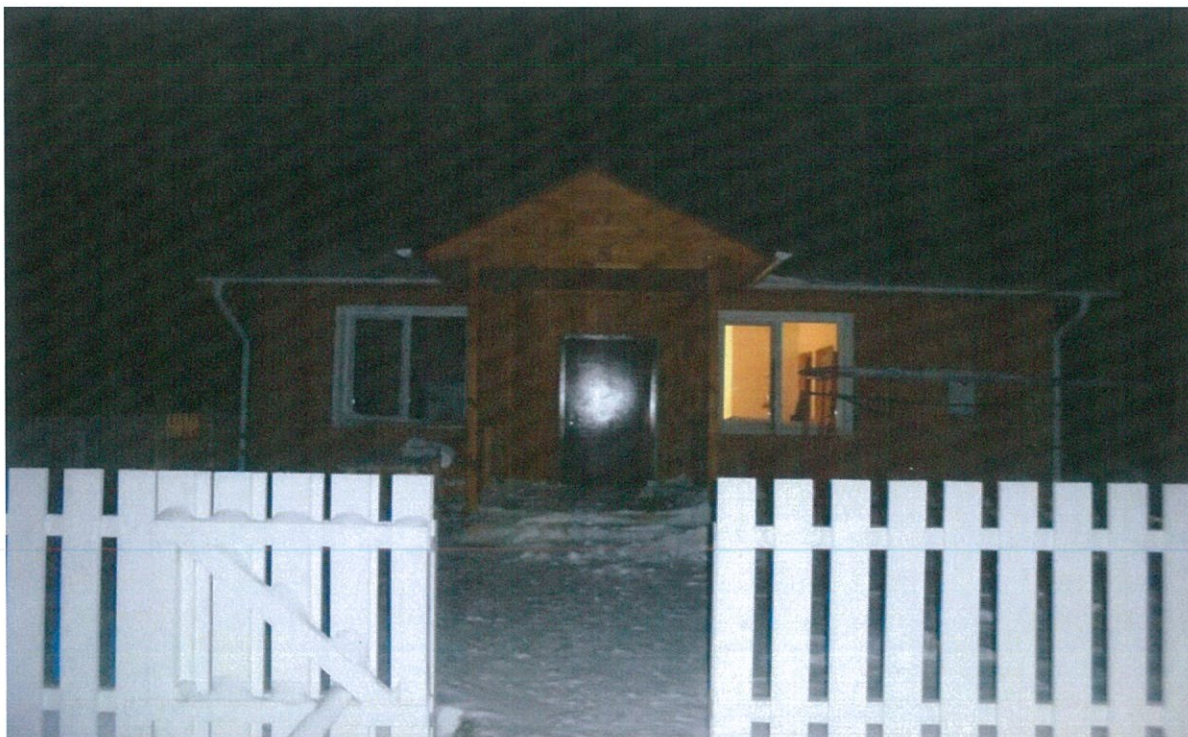

5. Павловский район, с. Павловск, капитальный ремонт детской поликлиники главного корпуса КГБУЗ «Павловская центральная районная больница», расположенного по адресу: ул. Кунгурова, д. 1.

Общая стоимость работ по капитальному ремонту составила 9 389,7 тыс. рублей.

Подрядчик - ООО СК «РемСтрой Регион».

В ходе проведения капитального ремонта выполнены работы по замене электропроводки, сетей водо-теплоснабжения. Проведена внутренняя отделка помещений.



***6. г. Барнаул, капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Городская
поликлиника № 14, г. Барнаул».***

Общая стоимость капитального ремонта составила 844,0 тыс. рублей.

Подрядчик - ООО «Монтаж-Элит».

В ходе проведения капитального ремонта выполнены работы по замене кровли.



**7. г. Заринск, капитальный ремонт входной группы
поликлинического отделения КГБУЗ «Центральная городская
больница, г. Заринск» по адресу: ул. 25 Партсъезда, 40.**

Общая стоимость работ по капитальному ремонту составила 1 529,8 тыс. рублей.

Подрядчик - ООО «РОСТ»

Проведены работы по капитальному ремонту входной группы поликлинического отделения больницы.



8. Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, капитальный ремонт стационара КГБУЗ «Панкрушихинская центральная районная больница».

Часть работ была начата в 2017 году. Государственный контракт с ООО «Строй-Инвест» заключен в 2017 году на сумму 22 719,1 тыс. рублей, из них оплачено в 2018 году 11 810,7 тыс. рублей.

Государственные контракты с ООО НПП «ЭЛТЕМ», ООО «Сибирь-Монтаж» заключены в 2018 году на сумму 718,9 тыс. рублей.

Общая стоимость работ по капитальному ремонту за 2017-2018 годы составила 23 523,3 тыс. рублей.

В ходе проведенных работ выполнен перенос медицинского газоснабжения, выполнены работы по капитальному ремонту стационара (общестроительные работы, водопровод и канализация). Произведена замена кровли, полов первого и второго этажей, системы отопления и электроснабжения.

Восстановлена отмостка, выполнены работы по устройству водосточной системы вентиляции, произведены отделочные работы.



**9. Тогульский район, с. Тогул, капитальный ремонт здания
стационара КГБУЗ «Тогульская центральная районная
больница».**

Общая стоимость работ по капитальному ремонту составила 22 768,0 тыс. рублей.

Подрядчик - ООО «ФундаментСпецСтрой»

В ходе проведения капитального ремонта выполнены работы по замене полов первого и второго этажей, системы отопления, окон, электрических сетей и вентиляции. Выполнены отделочные работы.



10. Зональный район, с. Зональное, капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГБУЗ «Зональная центральная районная больница».

Работы начаты в 2017 году. Общая стоимость работ по капитальному ремонту составила 15 621,3 тыс. рублей, из них оплачено в 2018 году 944,7 тыс. рублей.

Подрядчик - ООО «Эквилибриум».

В ходе проведения капитального ремонта выполнены работы по ремонту систем канализации, водоснабжения, электрических сетей, вентиляции. Выполнены отделочные работы керамической плиткой полов и стен, окраска стен и потолков.



11. Тальменский район, р.п. Тальменка, реконструкция здания административного корпуса КГБУЗ «Тальменская центральная районная больница» под размещение инфекционного отделения, расположенного по адресу: ул. Кирова, 68.

Общая стоимость работ по реконструкции объекта составила 18 351,2 тыс. рублей.

Подрядчик - ООО «Акмилайт».

В ходе проведения реконструкции работы по замене кровли, оконных и дверных блоков. Произведено усиление дверных проемов, перекрытия подвала и первого этажа. Выполнен ремонт кирпичной кладки, устройство перегородок, металлокаркаса крыльца. Проведены электротехнические, сантехнические работы и сетей канализации. Проведена внутренняя отделка помещений.

Приобретено медицинское оборудование, мебель и бытовая техника на общую сумму 562,3 тыс. рублей.





12. г. Барнаул, реконструкция зданий КГКУЗ «Алтайский противотуберкулезный диспансер», расположенных по адресу: Змеиногорский тракт, д. 110, под размещение КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» и строительство радиологического блока.

Закрытие контура главного корпуса.

Завершены работы по закрытию контура главного корпуса, начатые в 2017 году. Общая стоимость работ по реконструкции составила – 25 925,0 тыс. рублей, в том числе в 2018 году – 1 081,1 тыс. рублей. Подрядчик ООО "Автограф".



Объекты отрасли «Образование».

1. г. Барнаул, реконструкция зданий КГОУ лицея-интерната «Алтайский краевой педагогический лицей», расположенных по адресу: ул. Папанинцев, д. 113, 139, 139а в г. Барнауле Алтайского края. 3 этап. Реконструкция здания по адресу: ул. Папанинцев, д. 113, под учебный корпус.

Работы завершены в 1 квартале 2018 года. Реконструкция объекта производилась в рамках концепции создания детского Технопарка «Кванториум».

Генеральным подрядчиком по выполнению строительно-монтажных работ являлось ООО «Век-Строй», по государственному контракту от 04.09.2017 № Ф.2017.381813. На завершение работ по реконструкции здания технопарка выделено и освоено 43 360,2 тыс. рублей, в том числе в 2018 году – 13 756,5 тыс. рублей.



Объекты отрасли «Культура».

***1. г. Барнаул, капитальный ремонт учебного корпуса КГБОУ СПО
«Алтайский государственный музыкальный колледж»,
расположенного по адресу: ул. Песчаная, д. 84.***

Завершены работы, начатые в 2017 году, по капитальному ремонту объекта Подрядчик – ООО «Алтайэнергоконсалтинг». Общая стоимость ремонтных работ составила 54 684,8 тыс. рублей, в том числе в 2018 году – 20 994,4 тыс. рублей.

Выполнены следующие виды работ: демонтажные работы, стяжки по кровле, монтаж системы отопления, фасадные работы, утепление, и облицовка фасадов, электромонтажные работы, отделочные работы на всех этажах здания, изоляционные работы (стены, потолок).





Прочие объекты

1. Строительство административного здания, расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Взлетная, д. 2ж.

Строительство здания началось в 2014 году и осуществлялось в целях эффективной работы и осуществления в установленном порядке функций ККУ «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае».

Подрядные работы по завершению строительства выполнялись ООО «Строитель». Общая стоимость строительства составила 231 552,7 тыс. рублей, из них освоено в 2018 году – 86 676,3 тыс. рублей. Построено административное 5-ти этажное здание с надземным переходом и гараж на 12 автомобилей, приобретено оборудование на сумму 12 144,0 тыс. рублей.





8. Переходящие объекты.

Объекты отрасли «Здравоохранение».

1. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Совхозная ул., д. 2, с. Пещерка, Залесовский район.

В 2018 году начаты работы по строительству фельдшерско-акушерского пункта. В связи с расторжением заключенного контракта и длительными конкурентными процедурами по выбору подрядной организации новый государственный контракт заключен 14.12.2018 с ООО «Мильстрой-Сибирика» на сумму 3 529,2 тыс. рублей.

В 2018 году выполнены подготовительные земляные работы и геодезическая разбивка. Сдача объекта планируется в 2019 году.

2. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Юбилейная ул., д. 16, с. Новодраченино, Заринский район.

В 2018 году начаты работы по строительству фельдшерско-акушерского пункта. В связи с расторжением заключенного контракта и длительными конкурентными процедурами по выбору подрядной организации новый государственный контракт заключен 14.11.2018 с ООО «Империял» на сумму 3 346,2 тыс. рублей.

В 2018 году выполнены подготовительные земляные работы, изоляционные работы, ограждение земельного участка. Сдача объекта планируется в 2019 году.

3. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Ленина ул., д. 10, с. Солоновка, Новичихинский район.

В 2018 году заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «МильСтрой-Сибирика» на сумму 4 017,6 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту - 212 дней с даты заключения, до 05.08.2019.

4. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Центральная ул., д. 58а, с. Зайцево, Тальменский район.

В 2018 году заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «МильСтрой-Сибирика» на сумму 3 820,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту - 212 дней с даты заключения, до 05.08.2019.

5. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Юбилейная ул., д. 1а, с. Коротояк, Хабаровский район.

В 2018 году заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «МильСтрой-Сибирика» на сумму 4 069,1 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту - 212 дней с даты заключения, до 05.08.2019.

**6. Строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу:
Октябрьская ул., д. 2г, с. Куяган, Алтайский район.**

В 2018 году заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Модуль 54» на сумму 7 662,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту до 01.06.2019. В 2018 году выполнена геодезическая разбивка осей здания и инженерных сетей, проведены подготовительные работы (земляные работы) и общестроительные работы (устройство насыпей, щебеночного основания, арматурные работы), устройство фундаментов. Начата сборка и монтаж модульного здания. Ввод объекта планируется в 2019 году.

**7. Строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу:
Партизанская ул., д. 10б, с. Боровиково, Павловский район.**

В 2018 году заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Модуль 54» на сумму 5 593,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту до 01.06.2019. В 2018 году выполнена геодезическая разбивка осей здания и инженерных сетей, проведены подготовительные работы (земляные работы) и общестроительные работы (устройство насыпей, щебеночного основания, арматурные работы, устройство фундаментов. Начата сборка и монтаж модульного здания. Ввод объекта планируется в 2019 году.

**8. Строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу:
Гагарина ул., д. 1а, п. Озерный, Павловский район.**

В 2018 году заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Модуль 54» на сумму 5 769,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту до 01.06.2019. В 2018 году выполнена геодезическая разбивка осей здания и инженерных сетей, проведены подготовительные работы (земляные работы) и общестроительные работы (устройство насыпей, щебеночного основания, арматурные работы, устройство фундаментов. Начата сборка и монтаж модульного здания. Ввод объекта планируется в 2019 году.

**9. Строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу:
Гагарина ул., д. 35а, с. Белояровка, Топчихинский район.**

В 2018 году заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Модуль 54» на сумму 5 802,6 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту до 01.06.2019. В 2018 году выполнена геодезическая разбивка осей здания и инженерных сетей,

проведены подготовительные работы (земляные работы) и общестроительные работы (устройство насыпей, щебеночного основания, арматурные работы, устройство фундаментов. Начата сборка и монтаж модульного здания. Ввод объекта планируется в 2019 году.

***10. Строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу:
Луговая ул., д. 1, с. Зимино, Топчихинский район.***

В 2018 году заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Модуль 54» на сумму 5 955,1 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту до 01.06.2019. В 2018 году выполнена геодезическая разбивка осей здания и инженерных сетей, проведены подготовительные работы (земляные работы) и общестроительные работы (устройство насыпей, щебеночного основания, арматурные работы, устройство фундаментов. Начата сборка и монтаж модульного здания. Ввод объекта планируется в 2019 году.

***11. Строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу:
Центральная ул., д. 296, с. Тулата, Чарышский район.***

В 2018 году заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Модуль 54» на сумму 7 872,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту до 01.06.2019. В 2018 году выполнена геодезическая разбивка осей здания и инженерных сетей, проведены подготовительные работы (земляные работы) и общестроительные работы (устройство насыпей, щебеночного основания, арматурные работы, устройство фундаментов. Начата сборка и монтаж модульного здания. Ввод объекта планируется в 2019 году.

12. Павловский район, с. Павловск, капитальный ремонт главного корпуса КГБУЗ «Павловская центральная районная больница», расположенного по адресу: ул. Кунгурова, д. 1.

В 2018 году начаты работы по капитальному ремонту главного корпуса больницы. Заключен государственный контракт с ООО СК «РемСтрой Регион» на сумму 15 726,1 тыс. рублей. В 2018 году выполнены работы по замене электропроводки, замене сетей водо-тепло снабжения.



13. г. Барнаул, капитальный ремонт здания КГБУЗ «Алтайский онкологический диспансер», расположенного по адресу: ул. Матросова, д. 115, под КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул»

В 2017 году начаты работы по капитальному ремонту КГБУЗ «Алтайский онкологический диспансер» под КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул». Заключен государственный контракт с ООО «Спецстройинжиниринг» на сумму 66 146,8 тыс. рублей, из них принято и оплачено работ в 2018 году на сумму 22 884,2 тыс. рублей.

Выполнены кровельные работы, заменены оконные блоки. Проведены работы по устройству перегородок, полов, вентиляции, электромонтажные и штукатурные работы.



В 2018 году была произведена разработка проектной документации для завершения капитального ремонта здания.

14. Краснощекровский район, с. Краснощеково, капитальный ремонт зданий больничного комплекса КГБУЗ «Краснощековская центральная районная больница».

Работы начаты в 2017 году. Общая стоимость работ по капитальному ремонту составила 12 825,8 тыс. рублей, из них принято и оплачено работ в 2018 году 2 838,1 тыс. рублей. Подрядчик - ООО «Райагропромстрой»


В ходе проведения капитального ремонта выполнены работы по ремонту крыши, крыльца, произведена замена окон.



Для завершения работ по капитальному ремонту на объекте 01.12.2018 заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ с ООО «Компас» на сумму 43 355,5 тыс. рублей. Срок выполнения работ 240 дней с даты заключения контракта, срок действия контракта до 30.09.2019. Будут произведены работы по внутренней отделке здания.

***15. Кулундинский район, с. Кулунда, капитальный ремонт зданий
КГБУЗ «Кулундинская центральная районная больница».***

22.11.2018 заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ с ООО «МильСтрой-Сибирика» на сумму 26 885,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ 210 дней с даты заключения контракта, срок действия контракта до 30.06.2019. В рамках заключенного контракта в 2018 году были произведены демонтажные работы, теплоизоляция чердака, монтаж внутренних инженерных сетей (помещение прачечной).

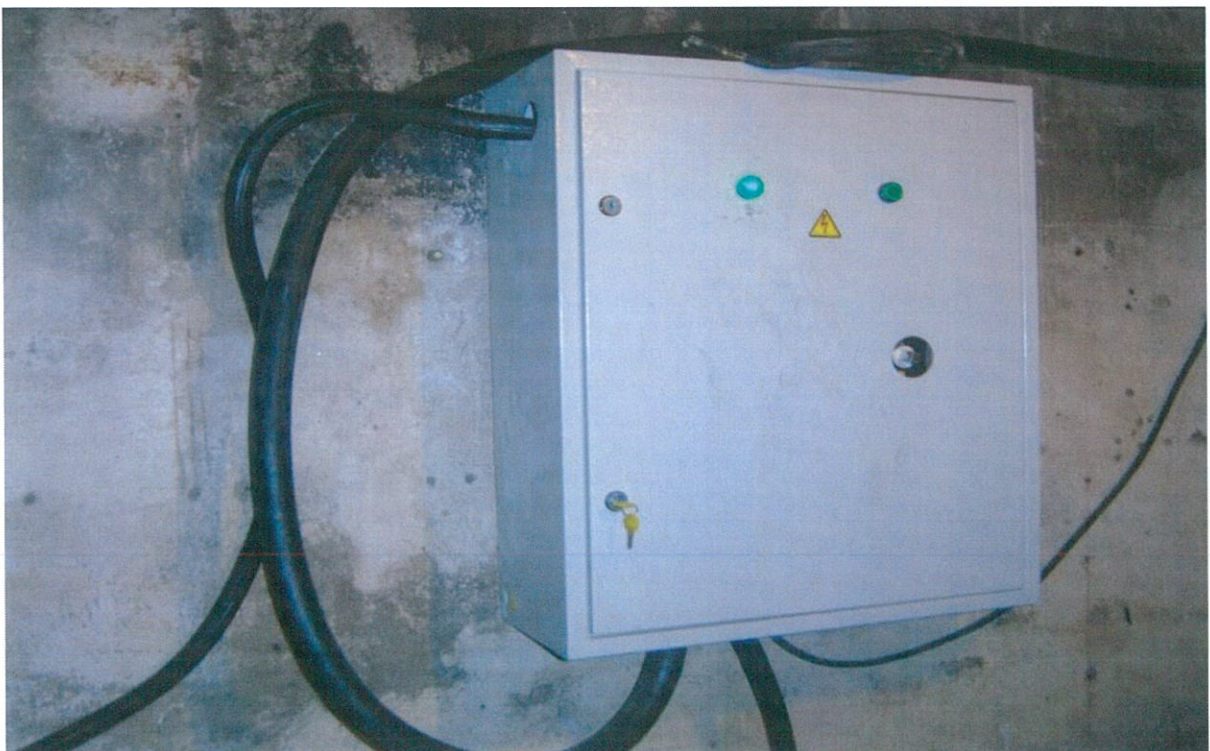

***16. Курьинский район, с. Курья, капитальный ремонт зданий КГБУЗ
«Курьинская центральная районная больница».***

Работы начаты в 2017 году. Общая стоимость работ по капитальному ремонту составила 18 680,9 тыс. рублей, из них принято и оплачено в 2018 году 1 703,1 тыс. рублей. Подрядчик - ООО «Райагропромстрой».

В ходе проведения капитального ремонта произведен ремонт крыши, фасада и замена окон в поликлинике и стационаре. Выполнены работы по усилению стен в поликлинике и устройству отмостки. Произведен ремонт теплосети и наружных сетей электроснабжения стационара.



Для завершения работ на объекте 10.09.2018 заключен государственный контракт на капитальный ремонт с ООО «Райагропромстрой» на сумму 49 933,7 тыс. рублей. Срок выполнения работ 360 дней с даты заключения контракта, срок действия контракта до 31.10.2019.

17. Целинный район, с. Целинное, капитальный ремонт больничного комплекса КГБУЗ «Целинная центральная районная больница».

Работы начаты в 2017 году. Общая стоимость работ по капитальному ремонту составила 23 536,4 тыс. рублей, из них принято и оплачено в 2018 году 1 486,6 тыс. рублей. Подрядчик - ООО «Акмилайт».

В ходе проведения капитального ремонта выполнены работы по замене кровли дневного стационара и детского отделения, устройству отмостки, замене окон. Произведен ремонт системы канализации, водоснабжения, электрических сетей. Выполнены отделочные работы.



В 2018 году разработана проектно-сметная документация для завершения работ на объекте, проведены конкурентные процедуры по выбору подрядчика.

***18. г. Бийск, капитальный ремонт инфекционного корпуса КГБУЗ
«Центральная городская больница, г. Бийск», расположенного по
адресу: ул. Садовая, д. 210.***

В 2018 году продолжен капитальный ремонт КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск». Заключен государственный контракт на капитальный ремонт инфекционного корпуса больницы с ООО «ПКФ «Отделстрой» на сумму 37 896,1 тыс. рублей. Срок выполнения работ 120 дней со дня подписания контракта, срок действия контракта до 30.06.2019.

В 2018 году в ходе проведения капитального ремонта выполнены работы по замене оконных и дверных блоков, отоплению и канализации. Проведена внутренняя отделка помещений.



19. г. Новоалтайск, реконструкция здания КГКУЗ «Краевая туберкулезная больница № 1», расположенного по адресу: ул. Белоярская, д. 1, под КГБУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер».

Подрядная организация-ООО «СЕЛФ».

В 2018 году проведены работы по выполнению обмерных работ и обследования строительных конструкций, подготовке заключений по результатам обследования и рекомендации по устранению выявленных дефектов зданий.

В рамках заключенного контракта на строительно-монтажные работы начаты работы по реконструкции пищеблока, прачечной, морга и проходной № 1.

В полном объеме выполнены работы:

- в пищеблоке - по ремонту кровли, демонтажу и монтажу сетей электроснабжения, произведена установка оконных блоков 1-го этажа;
- в прачечной - по уплотнению грунта щебнем, устройству бетонного пола техподполья, оштукатурен 1-го этаж;
- в проходной № 1 – по устройству бетонного основания под полы, произведена кладка и оштукатуривание кирпичных перегородок.



В стадии завершения работы по монтажу сетей электроснабжения в пищеблоке, кладке и оштукатуриванию перегородок в подвале, монтажу систем отопления и канализации в прачечной.

***20. Алтайский район, с. Алтайское, строительство зданий
больничного комплекса КГБУЗ «Алтайская центральная районная
больница».***

Строительство зданий больничного комплекса КГБУЗ «Алтайская центральная районная больница» Алтайский район, с. Алтайское будет осуществляться в несколько этапов.

На строительство поликлиники на 250 пос./смену с режимом работы в 1,5 смены (1 этап) заключен государственный контракт с ООО «Строй-Инвест» на сумму 178 695,8 тыс. руб. Срок выполнения работ 720 дней с момента заключения контракта, срок действия контракта до 20.12.2020.

Объекты отрасли «Образование».

1. Строительство средней общеобразовательной школы на 90 учащихся, сблокированной с детским садом на 40 мест в с. Покровка Локтевского района.

В 1 квартале 2019 года планируется завершить работы по строительству объекта. Строительство школы осуществляется в рамках Государственной программы Алтайского края «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016 - 2025 годы. Подрядные работы выполняются ООО «Строй-Индустрия», заключен государственный контракт от 29.12.2017 № Ф.2017.606977 на сумму 153 248,5 тыс. рублей. Срок выполнения работ 13 месяцев, в 2018 году освоено 89 385,1 тыс. рублей.



В рамках реализации мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2018 году начаты работы по строительству детских садов. Из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятия предусмотрены ассигнования в объеме 319 893,0 тыс. рублей, в том числе в 2018 году – 159 287,4 тыс. рублей, 2019 году – 160 605,6 тыс. руб.

2. Каменский район, г. Камень-на-Оби, строительство детского ясли-сада на 200 мест.

На выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и приобретение технологического оборудования заключен государственный контракт от 03.12.2018 № Ф.2018.580 с ООО «Строй-Инвест» на сумму 146 628,4 тыс. рублей, работы должны быть выполнены до 15.11.2019. В соответствии с условиями контракта произведен авансовый платеж на сумму 64 223,2 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 59 727,5 тыс. руб., краевого бюджета – 4 495,7 тыс. руб.

3. Первомайский район, пос. Сибирский, строительство детского ясли-сада на 140 мест.

На выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и приобретение технологического оборудования заключен государственный контракт от 06.12.2018 № Ф.2018.580743 с ООО «ВЕК-СТРОЙ» на сумму 103 924,6 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 15.11.2019. В соответствии с условиями контракта произведен авансовый платеж на сумму 42 816, 9 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 39 819,7 тыс. рублей, краевого бюджета – 2 997, 2 тыс. рублей.

4. г. Новоалтайск, строительство детского ясли-сада на 280 мест.

На выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и приобретение технологического оборудования заключен государственный контракт от 04.12.2018 № Ф.2018.580765 с ООО «СЕЛФ» на сумму 214 838,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 15.11.2019. В соответствии с условиями контракта произведен авансовый платеж на сумму 64 236,8 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 59 740,2 тыс. рублей, краевого бюджета – 4 496,6 тыс. рублей.

Объекты отрасли «Культура»

1. Строительство здания КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка», расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Пушкина, д. 41.

Общая сметная стоимость капитального строительства объекта в ценах 1 квартала 2017 года составляет 338 781,6 тыс. рублей. На выполнение строительно-монтажных работ заключен государственный контракт с ООО «СЕЛФ» от 22.12.2017 № Ф.2017.575896 на сумму 297 469,7 тыс. рублей, срок выполнения работ – 18 месяцев с даты заключения контракта. В 2018 году принято работ на сумму 106 745,4 тыс. рублей. Завершение работ по строительству планируется во 2-м квартале 2019 года.




2. г. Барнаул, реконструкция здания КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края», расположенного по адресу: просп. Ленина, д. 88 / просп. Калинина, д. 1. Завершение реконструкции.

Общая сметная стоимость завершения реконструкции в ценах 4 квартала 2017 года составляет 1 278 320,2 тыс. рублей. На выполнение строительно-монтажных заключен государственный контракт с ООО «СЕЛФ» от 23.11.2018 № Ф.2018-02-133 на сумму 611 691,9 тыс. рублей, срок выполнения работ – 815 дней с даты заключения контракта. В 2018 году принято работ на сумму 1 812,4 тыс. рублей. Завершение работ по контракту планируется в 1-м квартале 2021 года.

Объекты отрасли «Соцобеспечение»

1. Реконструкция лечебно-спального корпуса в лечебно-административный с пристройкой бассейна и спортивного зала КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики», расположенного в г. Барнауле по ул. Тихонова, д. 68.

На выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и приобретение технологического оборудования заключен государственный контракт от 13.06.2018 № Ф.2018.254003 с ООО «СПЕЦСТРОЙ-ИНЖЕНИРИНГ» на сумму 179 867,6 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 16 месяцев с даты заключения контракта. В 2018 году выполнено работ на сумму 87 283,6 тыс. рублей. В 2018 году выполнены следующие виды работ: устройство фундамента; устройство стен 1,2 этажей (блок 1,2); устройство пожарного резервуара и частично тепловой наружной сети; устройство металлического каркаса (блок 3).

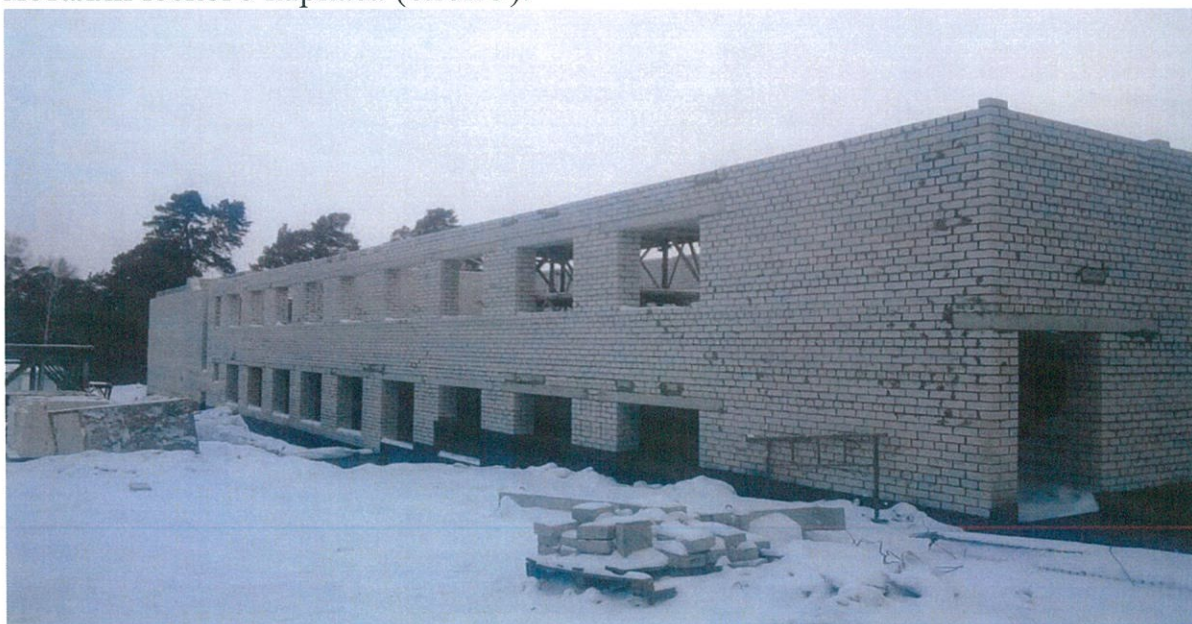

Финансирование реконструкции объекта осуществляется с участием средств Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставленных в


соответствии с соглашением от 12.02.2018 № АД-09-31/сог/43 на софинансирование расходных обязательств Алтайского края, связанных с реализацией мероприятий социальной программы, направленных на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания. В 2018 году на реализацию проекта из Пенсионного фонда РФ поступило 73 406,8 тыс. рублей.

Объекты отрасли «Жилищное строительство»

1. г. Барнаул, строительство общежития для работников краевых учреждений культуры, расположенного по адресу: ул. Сизова, д. 24.

Данный объект включен в подпрограмму «Социальное жилье» на 2014 – 2020 годы государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным комфортным жильем населения Алтайского края» 2014 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации Алтайского края от 31.10.2014 № 503.

На выполнение строительно-монтажных работ заключен государственный контракт от 05.10.2017 № Ф.2017.425860 с ООО «Строитель» на сумму 229 312,1 тыс. рублей, срок выполнения работ – 17,5 месяцев с даты заключения контракта. Исполнение контракта осуществляется с расширенным банковским сопровождением. На 01.01.2019 принято и оплачено работ по контракту 167 303,5 тыс. рублей, в том числе в 2018 году – 155 275,0 тыс. рублей.

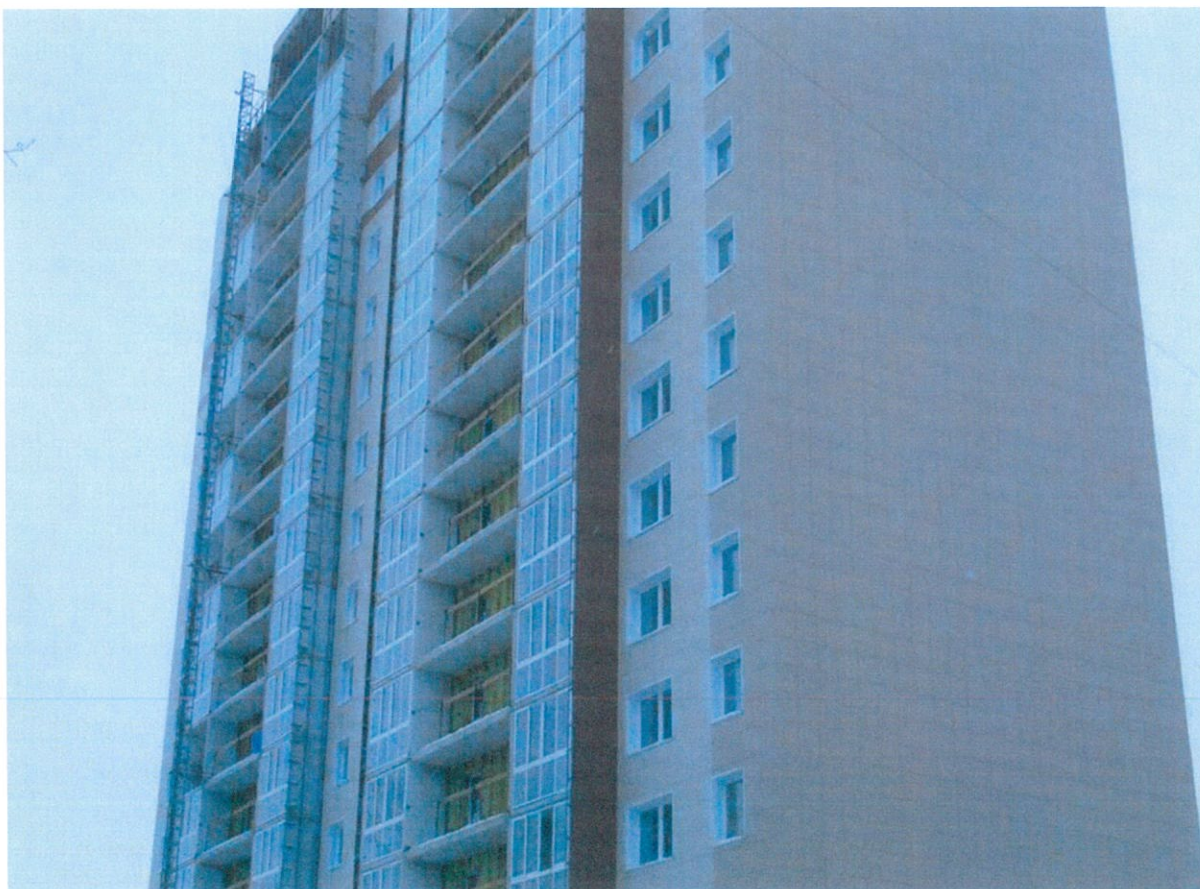

Объекты отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»

1. г. Барнаул, строительство наружных сетей центра медицинской реабилитации ортопедо-травматологического профиля (теплоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение).

Мероприятие направлено на создание на территории медицинского кластера города Барнаула инвестиционной площадки, обеспеченной надлежащей инженерной инфраструктурой, для ее дальнейшего предоставления потенциальным инвесторам и включено в подпрограмму «Формирование благоприятной инвестиционной среды» государственной программы Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 – 2020 годы.

Объект разделен на этапы. 1 этап – сети теплоснабжения и водоснабжения, 2 этап – сети канализации, 3 этап – внутриплощадочные сети.

По 1 этапу выполнено работ на сумму 5 826,5 тыс. рублей по контракту от 23.03.2018 № Ф.2018.96553 с ООО "Ремводстрой". Контракт не исполнен на сумму 2 432,8 тыс. рублей по решению заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств.

В 2018 году закончились работы по строительству внутриплощадочных сетей. Подрядная организация – ООО «АлтайПром», стоимость работ составила 17 665,4 тыс. рублей.

В 2019 году планируется завершить строительство сетей теплоснабжения, водоснабжения и построить сети канализации.

Прочие объекты

***1. г. Барнаул, капитальный ремонт административного здания,
расположенного по адресу: ул. Попова, д. 68.***

Реализация мероприятия предполагает выполнение капитального ремонта здания общей площадью почти 6000 кв. м., предназначенного для размещения Министерства юстиции Алтайского края по адресу: г. Барнаул, ул. Попова, 68. На выполнение работ по капитальному ремонту заключен государственный контракт от 07.09.2017 № Ф.2017.381628 с ООО «Новострой» на сумму 177 070,0 тыс. рублей. Исполнение контракта осуществляется с расширенным банковским сопровождением. Срок выполнения работ 22 месяца. На 01.01.2019 исполнено по контракту 124 279,3 тыс. рублей, в том числе в 2018 году - 107 190,0 тыс. рублей.



8. Перспективы работы на 2019 год.

В целях реализации краевой адресной инвестиционной программы на 2019 год, утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 29.12.2018 № 483, КГКУ «Единый стройзаказчик» определено государственным заказчиком в отношении 66 объектов капитального строительства, в том числе: образования – 21, здравоохранения – 34, культуры – 6, физической культуры и спорта – 1, жилищного строительства – 1, жилищно-коммунального хозяйства – 1, соцобеспечения – 1, прочих – 1.

Распоряжением Правительства Алтайского края от 29.12.2018 № 400-р о распределении средств краевого бюджета на выполнение мероприятий по капитальному ремонту социально-значимых объектов учреждение определено государственным заказчиком в отношении 10 объектов, в том числе: здравоохранения - 8, культуры – 1, прочих -1. Кроме того, учреждение выполняет функции государственного заказчика по 5 объектам, которые не вошли в указанные нормативно-правовые акты.

На реализацию данных мероприятий предусмотрен объем бюджетных ассигнований в сумме 3 051 148,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 2 047 897,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 927 902,9 тыс. рублей, за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации – 75 347,5 тыс. рублей.

Объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

№ п/п	Наименование объекта	Состояние	Цена контракта, (тыс.руб.)	Примечание
Образование				
1	Локтевский район, с. Покровка, строительство средней общеобразовательной школы на 90 учащихся, сблокированной с детским садом на 40 мест	Переходящий	153 248,5	Работы будут завершены в 1 квартале 2019 года
2	Каменский район, г. Камень-на-Оби, строительство детского ясли-сада на 200 мест	Переходящий	146 628,4	Работы будут завершены в 4 квартале 2019 года
3	г. Новоалтайск, строительство детского ясли-сада на 280 мест	Переходящий	214 838,8	Работы будут завершены в 4 квартале 2019 года
4	Первомайский район, пос. Сибирский, строительство детского ясли-сада на 140 мест	Переходящий	103 924,6	Работы будут завершены в 4 квартале 2019 года
5	г. Барнаул, реконструкция зданий КГОУ лицея-интерната «Алтайский краевой педагогический лицей», расположенных по адресу: ул. Папанинцев, д. 113, 139, 139а в г. Барнауле Алтайского края. 3 этап. Реконструкция здания по адресу: ул. Папанинцев, д. 113, под учебный корпус	Пусковой	44 037	Объект введен в эксплуатацию

КГКУ «Единый стройзаказчик»

№ п/п	Наименование объекта	Состояние	Цена контракта, (тыс.руб.)	Примечание
Здравоохранение				
6	Зональный район, с. Зональное, капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГБУЗ "Зональная центральная районная больница	Пусковой	16 011,4	Работы завершены
7	г. Барнаул, реконструкция зданий КГКУЗ «Алтайский противотуберкулезный диспансер», расположенных по адресу: Змеиногорский тракт, д. 110, под размещение КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» и строительство радиологического блока. Закрытие контура главного корпуса	Пусковой	25 925	Работы завершены
8	Капитальный ремонт входной группы поликлинического отделения КГБУЗ "Центральная городская больница, г.Заринск, ул.25 Партизанская, 40	Пусковой	1 529,8	Работы завершены
9	г. Барнаул, капитальный ремонт здания КГБУЗ «Алтайский онкологический диспансер», расположенного по адресу: ул. Матросова, д. 115, под КГБУЗ "Городская больница № 3, г. Барнаул	Переходящий	66 146,8	Работы завершены. Подготовлена заявка на выбор подрядной организации для завершения работ. НМЦК – 76 018 тыс. руб
9	Целинный район, с. Целинное, капитальный ремонт больничного комплекса КГБУЗ «Целинная центральная районная больница»	Переходящий	23 339,0 32 357,5	Работы завершены Контракт заключен 15.01.2019

КГКУ «Единый стройзаказчик»

№ п/п	Наименование объекта	Состояние	Цена контракта, (тыс.руб.)	Примечание
10	г. Барнаул, капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Городская поликлиника № 14, г. Барнаул»	Пусковой	844,0	Работы завершены
11	Тогуский район, с. Тогул, капитальный ремонт здания стационара КГБУЗ «Тогуская центральная районная больница	Пусковой	22 716,9	Работы завершены
12	Краснощекровский район, с. Краснощеково, капитальный ремонт зданий больничного комплекса КГБУЗ «Краснощековская центральная районная больница»	Переходящий	16 169 43 355,5	Работы завершены Работы будут завершены в 3 квартале 2019 года
13	Кулундинский район, с. Кулунда, капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Кулундинская центральная районная больница»	Переходящий	26 885,8	Работы будут завершены во 2 квартале 2019 года
14	Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, капитальный ремонт стационара КГБУЗ «Панкрушихинская центральная районная больница»	Пусковой Пусковой Пусковой	22 719,1 450,5 268,6	Работы завершены Работы завершены Работы завершены
15	Тальменский район, р.п. Тальменка, реконструкция здания КГБУЗ «Тальменская ЦРБ» под размещение инфекционного отделения	Пусковой	17 738,9	Работы завершены
16	Курынский район, с. Курья, капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Курынская центральная районная больница»	Переходящий	16 903,5 49 933,7	Работы завершены Работы будут завершены в 3 квартале 2019 года

КГКУ «Единый стройзаказчик»

№ п/п	Наименование объекта	Состояние	Цена контракта, (тыс.руб.)	Примечание
17	Павловский район, с. Павловск, капитальный ремонт детской поликлиники главного корпуса КГБУЗ «Павловская центральная районная больница», расположенного по адресу: ул. Кунгурова, д. 1	Пусковой	9 368,7	Работы завершены
18	Павловский район, с. Павловск, капитальный ремонт главного корпуса КГБУЗ «Павловская центральная районная больница», расположенного по адресу: ул. Кунгурова, д. 1	Переходящий	19 348,0	Работы будут завершены в 1 квартале 2019 года
19	г. Бийск, капитальный ремонт здания КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск», расположенного по адресу: ул. Садовая, д. 210	Переходящий	37 896,1	Работы будут завершены во 2 квартале 2019 года
20	г. Новоалтайск, реконструкция здания КГКУЗ «Краевая туберкулезная больница № 1», расположенного по адресу: ул. Белоярская, д. 1, под КГБУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер	Переходящий	829 909,3	Работы будут завершены в 2021 году
21	г. Новоалтайск, реконструкция здания КГКУЗ «Краевая туберкулезная больница № 1», расположенного по адресу: ул. Белоярская, д. 1, под КГБУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер». Ремонтно-восстановительные работы. Здание пищеблока. Здание	Переходящий	12 992,8	Работы будут завершены в 1 квартале 2019 года

КГКУ «Единый стройзаказчик»

№ п/п	Наименование объекта	Состояние	Цена контракта, (тыс.руб.)	Примечание
	прачечной, дезинфекционной камеры. Здание патологоанатомического корпуса.			
22	Строительство зданий больничного комплекса КГБУЗ «Алтайская центральная районная больница" Алтайский район С. Алтайское. 1 этап - строительство поликлиники на 250 пос/смену с режимом работы в 1,5 смены	Переходящий	178 695,8	Вновь начинаемый объект
23	Строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Алтайский край, Завьяловский район, с. Светлое, ул. Центральная, 40а	Пусковой	3 474,2	Объект введен в эксплуатацию
24	Строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Алтайский край, город Славгород, с. Покровка, ул. Титова, 30	Пусковой	3 527,1	Объект введен в эксплуатацию
25	Строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Алтайский край, Красногорский район, с. Березовка, ул. Советская, 49б	Пусковой	3 598,6	Объект введен в эксплуатацию
26	Строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Алтайский край, Ключевской район, с. Зеленая Поляна, пер. Школьный, 4	Пусковой	3 500,5	Объект введен в эксплуатацию

КГКУ «Единый застройщик»

№ п/п	Наименование объекта	Состояние	Цена контракта, (тыс.руб.)	Примечание
27	Строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Алтайский край, Залесовский район, с. Пешерка, ул. Совхозная, 2	Переходящий	3 529,2	Работы будут завершены во 2 квартале 2019 года
28	Строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Алтайский край, Заринский район, с. Новодраченино, ул. Юбилейная, д. 16	Переходящий	3 346,2	Работы будут завершены во 2 квартале 2019 года
29	Строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Алтайский край, Хабаровский район, с. Коротояк, ул. Юбилейная, д.1а	Переходящий	4 069,1	Вновь начинаемый объект
30	Строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Алтайский край, Тальменский район, с. Зайцево, ул. Центральная, д. 58а	Переходящий	3 820,3	Вновь начинаемый объект
31	Строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Алтайский край, Новичихинский район, с. Солоновка, ул. Ленина, д. 10	Переходящий	4 017,6	Вновь начинаемый объект
32	Строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Куяган, ул. Октябрьская, д. 2г	Переходящий	7 662,3	Работы будут завершены во 2 квартале 2019 года
33	Строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта,	Переходящий	5 593,8	Работы будут завершены во 2 квартале 2019 года

КГКУ «Единый стройзаказчик»

№ п/п	Наименование объекта	Состояние	Цена контракта, (тыс.руб.)	Примечание
	расположенного по адресу: Алтайский край, Павловский район, с. Боровиково, ул. Партизанская, д. 10б			
34	Строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Алтайский край, Павловский район, пос. Озерный, ул. Гагарина, д. 1а	Переходящий	5 769,4	Работы будут завершены во 2 квартале 2019 года
35	Строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, с. Зимино ул. Луговая, д. 1	Переходящий	5 955,1	Работы будут завершены во 2 квартале 2019 года
36	Строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, с. Белояровка ул. Гагарина, д. 35а	Переходящий	5 802,6	Работы будут завершены во 2 квартале 2019 года
37	Строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Тулата, ул. Центральная, 29б	Переходящий	7 872,8	Работы будут завершены во 2 квартале 2019 года
Культура				

КГКУ «Единый стройзаказчик»

№ п/п	Наименование объекта	Состояние	Цена контракта, (тыс.руб.)	Примечание
38	г. Барнаул, строительство здания КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка», расположенного по адресу: ул. Пушкина, д. 41	Переходящий	297 469,7	Работы будут завершены во 2 квартале 2019 года
39	г. Барнаул, реконструкция здания КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края», расположенного по адресу: просп. Ленина, д. 88 / просп. Калинина, д. 1. Завершение реконструкции	Переходящий	611 692	Работы будут завершены в 1 квартале 2021 года
40	г. Барнаул, капитальный ремонт учебного корпуса КГБОУ СПО «Алтайский государственный музыкальный колледж», расположенного по адресу: ул. Песчаная, д. 84	Пусковой	42 784	Работы завершены
Социальное обеспечение				
41	Реконструкция лечебно-спального корпуса в лечебно-административный с пристройкой бассейна и спортивного зала КГБУСО "Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Журавлики", расположенного в г. Барнауле по ул. Тихонова, д. 68	Переходящий	179 867,5	Работы будут завершены в 4 квартале 2019 года
Жилищное строительство				
42	г. Барнаул, строительство общежития для работников краевых учреждений культуры, расположенного по адресу: ул. Сизова, д. 24	Переходящий	229 312	Работы будут завершены во 2 квартале 2019 года

КГКУ «Единыйстройзаказчик»

№ п/п	Наименование объекта	Состояние	Цена контракта, (тыс.руб.)	Примечание
Жилищно-коммунальное хозяйство				
43	г. Барнаул, строительство наружных сетей центра медицинской реабилитации ортопедо-травматологического профиля"(1 этап - теплоснабжение, водоснабжение)	Переходящий	8 259,2	Работы будут завершены во 2 квартале 2019 года
	г. Барнаул, строительство наружных сетей центра медицинской реабилитации ортопедо-травматологического профиля (теплоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение). Внутриплощадочные сети	Пусковой	17 665,4	Работы завершены
Прочие расходы				
44	г. Барнаул, строительство административного здания, расположенного по адресу: ул. Взлетная, д. 2ж	Пусковой	171 834	Работы завершены. Объект будет введен в эксплуатацию в 1 квартале 2019 года
45	г. Барнаул, капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу: ул. Попова, д. 68	Переходящий	177 070	Работы будут завершены во 2 квартале 2019 года
