


КГКУ

ЕДИНЬИЙ СТРОИЙЗАКАЗЧИК



ОТЧЕТ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2019 ГОД

1. Общие сведения об Учреждении

Краевое государственное казенное учреждение «Единый заказчик капитального строительства Алтайского края» было создано постановлением Администрации Алтайского края от 18.12.2014 № 559 в целях оптимизации управления строительной отраслью в крае.

Основная цель деятельности Учреждения – государственный заказчик в сфере проектирования, реконструкции и строительства краевых объектов, финансируемых за счет средств краевого и федерального бюджетов.

Юридический адрес: 656043, г. Барнаул, ул. Никитина, д. 78.

Электронный адрес: office@ez22.ru

Сайт: www.ez22.ru.



2. Деятельность отдела юридического, кадрового и общего обеспечения

По состоянию на 31.12.2019 Учреждение укомплектовано штатами на 98,5%. Штатная численность составляет 65 единиц при предельной штатной численности 66 единиц.

В 2019 году значительно увеличился объем документооборота в Учреждении.

В таблице приведены показатели входящей и исходящей документации в 2017-2019 гг., которые демонстрируют существенный рост ее количества в рассматриваемом периоде:

	2017	2018	2019	Рост (%)
Исходящая документация	2711 единиц	5344 единиц	7823 единиц	189%
Входящая документация	2661 единиц	5415 единиц	6832 единиц	156%

По состоянию на 31.12.2019 в стадии исполнения находится 138 государственных контрактов (договоров) на общую сумму 4077 млн рублей, в том числе:

заключенных по результатам конкурентных процедур:

- СМР - 36 на сумму 3850 млн рублей;
- ПСД - 32 на сумму 174 млн рублей;
- поставка оборудования и мебели - 19 на сумму 10 млн рублей;

заключенных с единственным поставщиком - 51 на сумму 43 млн рублей.

По итогам 2019 года, в рамках текущей деятельности Учреждения, отделом юридического, кадрового и общего обеспечения принято участие в рассмотрении 32-х жалоб участников закупок на действия заказчика, уполномоченного учреждения, поступивших в УФАС по Алтайскому краю и 2-х, поступивших в центральный аппарат ФАС России.

В связи уклонением участника закупки, признанного победителем, от заключения государственного контракта в УФАС по Алтайскому краю направлена информация о включении в реестр недобросовестных поставщиков, в отношении которого принято решение о включении в реестр.

В рамках претензионной работы в целях урегулирования споров в адрес контрагентов направлено 28 претензий и требований, из них в досудебном порядке исполнено - 18.

В 2019 году на рассмотрении Арбитражного суда Алтайского находилось 26 дел, из них: 16 - гражданских, 1 - банкротное, 9 – административных. Учреждение выступало в качестве истца по 12 процессам, ответчика - 10, третьего лица - 4.

Рассмотрение 13 дел Арбитражным судом окончено, решения вступили в законную силу. Рассмотрение 13 дел по существу не окончено, судебные решения не приняты.

В рамках деятельности Учреждения по применению к поставщикам (подрядчика, исполнителям) неустойки за просрочку исполнения принятых на себя обязательств по государственным контрактам начислена пеня в размере 3023 тыс. рублей, в добровольном порядке контрагентами уплачена в размере 499,6 тыс. рублей. Указанная сумма перечислена в доход Алтайского края. В отношении контрагентов, не исполнивших требования заказчика об уплате неустойки в добровольном порядке, начата претензионно-исковая работа.

В 2019 году в бюджет Алтайского края на основании исполнительного листа взыскана сумма неосновательного обогащения по государственному контракту от 15.08.2017 № Ф.2017.346395 на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт (выборочно), устройство чердачной крыши здания учебного корпуса «Заринского детского дома» в размере 293,5 тыс. рублей.

При осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение государственной регистрации права собственности Алтайского края на объекты недвижимости в 2019 году, отделом совершено 203 регистрационных действия.

3. Деятельность отдела бухгалтерского учета и финансовой отчетности

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края о наделении полномочий администраторов доходов краевого бюджета учреждением за 2019 год перечислено по возмещению в бюджет Алтайского края доходов на сумму 924,9 тыс. рублей по следующим статьям:

Наименование показателя	2019
Доходы, тыс. руб.	924,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	2,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации	922,5

Законом Алтайского края от 05.12.2018 № 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2019-2020 годов» Учреждению доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 44700 тыс. рублей, израсходовано денежных средств в сумме 44452,3 тыс. рублей, что составило 99,4% от плановых назначений.

Анализ расходов учреждения представлен в виде таблицы:

Наименование показателя	2019	
	тыс. руб.	удельный вес, %
Расходы	44452,3	100 %
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	38506	86,6 %
Коммунальные расходы	522,7	1,2 %
Услуги связи	306,5	0,7 %
Прочие расходы	3618,8	8,1 %
Налоги (имущество, земельный, транспортный)	1498,3	3,4 %

4. Осуществление функций государственного заказчика

В целях реализации краевой адресной инвестиционной программы на 2019 год, утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 29.12.2018 № 483, и мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов в соответствии с распоряжением Правительства Алтайского края от 14.06.2019 № 222-р КГКУ «Единый стройзаказчик» выполняло функции государственного заказчика в отношении 89 объектов капитального строительства.

КГКУ «Единый стройзаказчик»

В таблице приведен сравнительный анализ по количеству объектов, закрепленных за Учреждением, в 2018 - 2019 гг.

2018		2019	
Всего 79		Всего 89	
Объекты образования	13	Объекты образования	25
Объекты здравоохранения	46	Объекты здравоохранения	44
Объекты спорта	2	Объекты спорта	3
Объекты культуры	10	Объекты культуры	9
Объекты социального обеспечения	1	Объекты социального обеспечения	1
Объекты жилищного строительства	1	Объекты жилищного строительства	1
Объекты ЖКХ	1	Объекты ЖКХ	1
Прочие объекты	5	Прочие объекты	5

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной программы и мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов в 2019 году, составил 2556,6 млн рублей, в том числе из средств краевого бюджета - 1738,4 млн рублей, средств федерального бюджета - 742,9 млн рублей и средств Пенсионного фонда Российской Федерации - 75,3 млн рублей.

Общий объем израсходованных средств на реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной программы и по капитальному ремонту социально значимых объектов в 2019 году составил 2204,2 млн рублей, в том числе средств краевого бюджета - 1485,9 млн рублей, средств федерального бюджета - 643,0 млн рублей и средств Пенсионного фонда Российской Федерации - 75,3 млн рублей.

Объем освоенных средств в 2019 году превышает аналогичный показатель 2018 года в 1,9 раза.

Общий процент освоения денежных средств, выделенных на объекты в 2019 году за счет всех источников финансирования составил 86,2%.

Сравнительный анализ общего объема израсходованных средств на реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной программы за период 2017-2019 гг.



5. Деятельность Учреждения в области проектирования

Выполняя функции государственного и технического заказчика, Учреждением в 2019 году:

1. Заключено 19 государственных контрактов на проектирование объектов по итогам проведенных конкурентных процедур.

2. Получены положительные заключения КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» по 27 объектам, в том числе:

- 10 детских яслей-садов в г. Новоалтайске, г. Камень-на-Оби, г. Рубцовске, р.п. Тальменка Тальменского района, с. Залесово Залесовского района, с. Пospelиха Пospelихинского района, с. Топчиха Топчихинского района, с. Ая Алтайского района, с. Целинное Целинного района, пос. Фирсова Слобода Первомайского района.

- 4 школы в г. Новоалтайске, с. Покровка Локтевского района, с. Ларичиха Тальменского район, с. Заводское Троицкого района.

- 2 поликлиники в г. Барнауле в квартале 2002а, в с. Советское Советского района.

- реконструкция (пристройка перехода) КГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 7, в г. Барнауле;

- капитальный ремонт учебного корпуса КГБОУ СПО «Алтайский государственный музыкальный колледж», расположенного по адресу: ул. Песчаная, д. 84;

- строительство культурно-спортивного центра в с. Шелаболиха Шелаболихинского района;


- строительство крытого катка с искусственным льдом КГБУ ДО «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по хоккею «Алтай», расположенного по адресу: г. Барнаул, просп. Сибирский, д. 52. Завершение строительства;

- реконструкция лечебно-спального корпуса в лечебно-административный КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики»;

- 5 положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости по фельдшерско-акушерским пунктам в Первомайском, Суетском, Павловском районах, пос. Березовка, пос. Новомихайловка г. Барнаула;

- 1 положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости по капитальному ремонту административного здания, расположенного по адресу: ул. Попова, д. 68. Завершение капитального ремонта».

Анализ количества объектов, по которым получены положительные заключения КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» за период 2017 - 2019 гг представлен на следующей диаграмме.

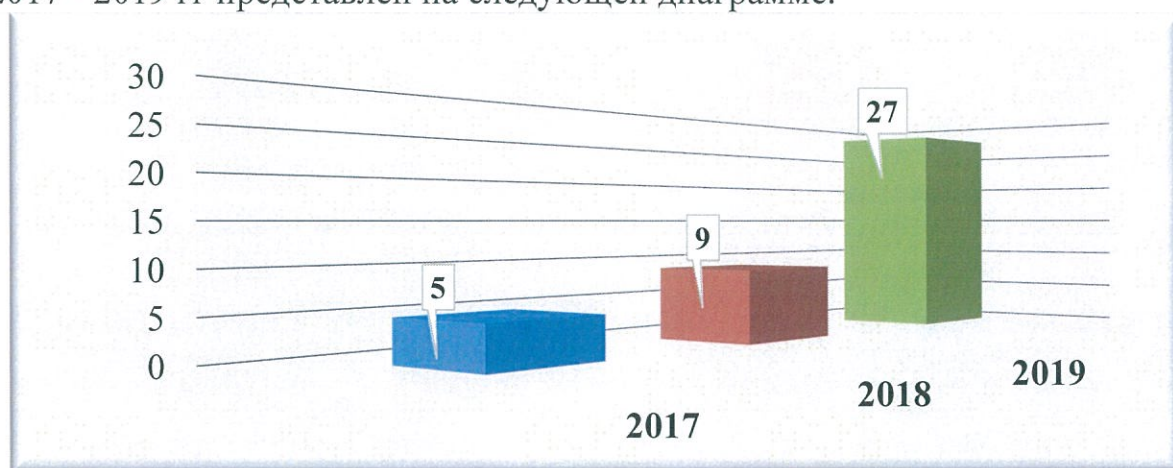

3. Получено 11 положительных заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства КАУ «Алтайский региональный центр ценообразования в строительстве», в том числе:

- фельдшерско-акушерский пункт в с. Паново Ребрихинского района;
- 10 заключений по каждому этапу объекта «г. Заринск, капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Заринск».

4. Передана на государственную экспертизу проектная документация для проведения проверки в 2020 году по 6 объектам, в том числе:

- 2 детских ясли – сада в г. Белокурихе, с. Боровиха Первомайского района;

- 1 школа в с. Повалиха Первомайского района;

- КАУ "Алтайский государственный театр кукол "Сказка", расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Пушкина, д.41;

- хирургический корпус на 165 коек КГБУЗ "Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства", расположенный по адресу: г. Барнаул, ул. Гущина, д.179;

- больничный комплекс КГБУЗ «Онкологический диспансер в г. Бийске, 1 этап.

6. Деятельность отдела государственных закупок

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по итогам работы за 2019 год проведена 161 конкурентная процедура, завершившиеся заключением контрактов на сумму 2453,3 млн рублей, из них:

- 21 открытый конкурс на сумму 135,6 млн рублей;
- 1 конкурс с ограниченным участием на сумму 4,6 млн рублей;
- 139 электронных аукционов на сумму 2313,1 млн рублей.

Количество проведенных в 2019 году конкурентных процедур превышает аналогичный показатель 2018 года на 87 %. При этом, не состоялись или были отменены 14 конкурентных закупок.

В 2019 году проведено 34 закупки у единственного поставщика, кроме п. 4 ч.1 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ, на сумму 15,4 тыс. рублей.

Для субъектов малого предпринимательства проведено 106 конкурентных процедур, из которых в 16 процедурах установлено требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства.

Экономия, достигнутая по итогам конкурентных процедур за 2019 год, составила 122,1 млн рублей.

7. Объекты капитального строительства

7.1 Объекты отрасли «Образование»

На реализацию мероприятий по строительству объектов отрасли «Образование» в 2019 году израсходовано 823,8 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 540,7 млн рублей, средств краевого бюджета – 283,1 млн рублей.

В 2019 году введено в эксплуатацию 3 объекта капитального строительства - средняя общеобразовательная школа на 90 учащихся, сблокированная с детским садом на 40 мест и 2 детских ясли-сада на 140 и 280 мест, продолжается строительство 11 объектов - 9 детских садов и 2 школ.

7.1.1 Строительство детских яслей-садов

В рамках национального проекта «Демография» и входящего в него федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет», в ходе реализации мероприятий по созданию в Алтайском крае дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования построены 2 детских ясли-сада и продолжается строительство 1

детского ясли-сада. В 2019 году на эти цели было истрчено 267,6 млн рублей, в том числе федерального бюджета - 160,6 млн рублей, краевого бюджета - 107,0 млн рублей.

1. г. Новоалтайск, строительство детского ясли-сада на 280 мест

Строительство объекта завершено в 4 квартале 2019 года.

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.12.2019 № 22-RU22308000-106-2018.

Подрядная организация: ООО «СЕЛФ».

Общая стоимость строительства, включая расходы на приобретение оборудования (9,9 млн рублей) и прочие затраты, составила 253,8 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета - 170,3 млн рублей, из краевого бюджета - 83,5 млн рублей.



2. Первомайский район, пос. Сибирский, строительство детского ясли-сада на 140 мест

Строительство объекта завершено, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2019 № 22-RU22533316-61-2019.

Подрядная организация: ООО «Век-Строй».

Общая стоимость строительства, включая расходы на приобретение оборудования (6,7 млн. рублей) и прочие затраты, составила 122,7 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета - 84,8 млн рублей, из краевого бюджета - 37,9 млн рублей.



3. Каменский район г. Камень-на-Оби, строительство детского ясли-сада на 200 мест

На выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и приобретение технологического оборудования заключен государственный контракт от 03.12.2018 № Ф.2018.580 с ООО «Строй-Инвест» на сумму 165,5 млн рублей, работы должны быть выполнены до 01.08.2020.

В рамках национального проекта «Демография» в 2019 году начато строительство семи детских яслей-садов. Из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий предусмотрены ассигнования в объеме 1139,0 млн рублей, в том числе в 2019 году – 186,0 млн рублей, 2020 году – 486,5 млн рублей, в 2021 году – 466,5 млн рублей.

4. г. Рубцовск, строительство детского ясли-сада на 280 мест

Завершить работы по строительству объекта планируется в 4 квартале 2021 года.

Подрядные работы выполняются ООО «Новострой», заключен государственный контракт от 24.12.2019 № Ф.2019.014258 на сумму 276,8 млн рублей.

5. Алтайский район, с. Ая, строительство детского ясли-сада на 140 мест

На выполнение работ по строительству объекта заключен государственный контракт от 20.12.2019 № Ф.2019.014264 с ООО «ПКФ «Отделстрой» на сумму 176,8 млн рублей, работы должны быть выполнены до 20.12.2020.

6. Залесовский район, с. Залесово, строительство детского ясли-сада на 140 мест

На выполнение работ по строительству объекта заключен государственный контракт от 24.12.2019 № Ф.2019.014245 с ООО «Акмилайт» на сумму 151,5 млн рублей. Срок выполнения работ до 01.04.2021.

7. Первомайского район, мкр. Фирсова Слобода, строительство детского ясли-сада на 280 мест

На выполнение работ по строительству объекта заключен государственный контракт от 24.12.2019 № Ф.2019.014220 с ООО «Век-Строй» на сумму 276,7 млн рублей. Срок выполнения работ до 01.11.2021.

8. Пospelихинский район, с. Пospelиха, строительство детского ясли-сада на 140 мест

На выполнение работ по строительству объекта заключен государственный контракт от 24.12.2019 № Ф.2019.014985 с ООО «Строй-Инвест» на сумму 194, 9 млн рублей. Срок выполнения работ до 20.12.2020.

9. Тальменский район, р.п. Тальменка, строительство детского ясли-сада на 140 мест

На выполнение работ по строительству объекта заключен государственный контракт от 19.12.2019 № Ф.2019.014156 с ООО «Век-Строй» на сумму 154,1 млн рублей. Срок выполнения работ до 20.12.2020.

10. Целинный район, с. Целинное, строительство детского ясли-сада на 140 мест

На выполнение работ по строительству объекта заключен государственный контракт от 22.12.2019 № Ф.2019.014984 с ООО «АСФ» на сумму 169,9 млн рублей. Срок выполнения работ до 20.12.2020.

11. Целинный район, с. Воеводское, строительство детского сада на 80 мест

На выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и приобретение технологического оборудования заключен государственный контракт от 30.03.2019 № Ф.2019.131843 с ООО «Прометей» на сумму 57,0 млн. рублей. В 2019 году выполнено работ на сумму 37,7 млн. рублей.

7.1.2 Строительство школ

1. Локтевский район, с. Покровка, строительство средней общеобразовательной школы на 90 учащихся, блокированной с детским садом на 40 мест

Строительство объекта завершено в 3 квартале 2019 года. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 24.09.2019 № 22-RU22526313-02-2017. Подрядная организация: ООО «Строй-Индустрия».

Общая стоимость строительства, включая расходы на приобретение оборудования и прочие затраты, составила 171,7 млн рублей.





2. Волчихинский район, с. Усть-Волчиха, строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся

В рамках национального проекта «Образование», входящего в него федерального проекта «Современная школа» начато строительство школ в с. Усть-Волчиха.

На выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и приобретение технологического оборудования заключен государственный контракт от 29.01.2019 № Ф.2019.1424 с ООО «Новострой» на сумму 188,6 млн рублей.

В 2019 году выполнено работ на сумму 130,3 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета - 129,0 млн рублей, из краевого бюджета - 1,3 млн рублей.

Срок выполнения работ до 01.08.2020.

3. Троицкий район, с. Заводское, строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся

В рамках национального проекта «Образование» заключен государственный контракт на строительство от 20.12.2019 № Ф.2019.014182 с ООО «ГПО №1» на сумму 252,5 млн рублей.

Срок выполнения работ до 01.12.2020.

7.2 Объекты отрасли «Здравоохранение»

На реализацию мероприятий по отрасли «Здравоохранение» в 2019 году выделено 969,5 млн рублей, израсходовано 688,4 млн рублей, из них - 102,2 млн рублей за счет средств федерального бюджета, 586,2 млн рублей средств краевого бюджета.

В рамках реализации государственной программы Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020 годы в 2019 году на строительство фельдшерско-акушерских пунктов из средств федерального бюджета поступило 6,8 млн. рублей, краевого бюджета 24,0 млн рублей.

В рамках реализации государственной программы Алтайского края «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года» в 2019 году на строительство фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек из средств федерального бюджета поступило 15,4 млн рублей, краевого бюджета 15,7 млн рублей.

В 2019 году построены и введены в эксплуатацию 8 фельдшерско-акушерских пунктов каркасно-панельного типа проектной мощностью - 15 посещений в смену и 9 модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

1. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, по адресу: Совхозная ул., д. 2, с. Пещерка, Залесовский район

Общая стоимость строительства составила 3, 7 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1,6 млн рублей. Подрядная организация - ООО «МильСтрой-Сибирика». Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.07.2019 № 22-512409-596-2019.

2. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, по адресу: Юбилейная ул., д. 16, с. Новодраченино, Заринский район

Общая стоимость строительства за счет средств краевого бюджета составила 3,3 млн рублей. Подрядная организация - ООО «Империял». Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 19.07.2019 № 22-RU22513310-006-2019.



**3. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, по адресу:
Ленина ул., д. 10, с. Солоновка, Новичихинский район**

Общая стоимость строительства составила 4,3 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 2,5 млн. рублей. Подрядчик - ООО «МильСтрой-Сибирика». Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.07.2019 № RU 22-529305-1-2019.



**4. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, по адресу:
Центральная ул., д. 58а, с. Зайцево, Тальменский район**

Общая стоимость строительства за счет средств краевого бюджета составила 4,1 млн. рублей. Подрядная организация - ООО «МильСтрой-Сибирика». Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 01.08.2019 № 22-RU22547304-01-2019.



**5. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, по адресу:
Строительная ул., д. 60, пос. Казачий, Первомайский район**

Общая стоимость строительства за счет средств краевого бюджета составила 4,3 млн.рублей. Подрядчик - ООО «МильСтрой-Сибирика». Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 03.12.2019 № 22-RU22533305-49-2019.

**6. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, по адресу:
Карла Маркса ул., д. 22б, с. Паново, Ребрихинский район**

Общая стоимость строительства за счет средств краевого бюджета составила 2,9 млн.рублей. Подрядная организация - ООО «БЛОК».

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 19.12.2019 № 22-RU22536309-014-2019.



**7. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, по адресу:
Школьная ул., д. 33а, с. Нижняя Суетка, Суетский район**

Общая стоимость строительства за счет средств краевого бюджета составила 4,6 млн.рублей. Подрядчик - ООО «МильСтрой-Сибирика». Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.12.2019 № 22-545308-05-2019.

**8. Строительство фельдшерско-акушерского пункта, по адресу:
Юбилейная ул., д. 1а, с. Коротояк, Хабаровский район**

Общая стоимость строительства составила 4,3 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета 2,5 млн рублей. Подрядная организация - ООО «МильСтрой-Сибирика». Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.07.2019 № 22-RU22556302-14-2019.

**9. Строительство модульного фельдшерско-акушерского
пункта, по адресу: Октябрьская ул., д. 2г, с. Куяган, Алтайский район**

Общая стоимость строительства составила 7,8 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5,5 млн рублей. Подрядная организация - ООО «Модуль 54». Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 27.06.2019 № 22-RU22502304-119-2019.



**10. Строительство модульного фельдшерско-акушерского
пункта, по адресу: Партизанская ул., д.10б, с. Боровиково, Павловский
район**

Общая стоимость строительства составила 5,8 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета 4,3 млн рублей. Подрядная организация - ООО «Модуль 54». Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 24.06.2019 № 22RU22531308-044-2019.

11. Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта, по адресу: Гагарина ул., д. 1а, п. Озерный, Павловский район

Общая стоимость строительства составила 5,9 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета 4,3 млн рублей. Подрядная организация - ООО «Модуль 54». Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 24.06.2019 № 22RU22531308-03-2019.



12. Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта, по адресу: Гагарина ул., д. 35а, с. Белояровка, Топчихинский район

Общая стоимость строительства составила 6,1 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5,1 млн рублей. Подрядная организация - ЗАО «Топчихинское строительно-монтажное предприятие». Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.06.2019 № 22RU22549301-05-2019.



13. Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта, по адресу: Луговая ул., д. 1, с. Зимино, Топчихинский район

Общая стоимость строительства составила 6,1 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета 4,3 млн рублей. Подрядная организация - ООО «Модуль 54». Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.06.2019 № 22-RU22549303-04-2019.



14. Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта, по адресу: Центральная ул., д. 296, с. Тулата, Чарышский район

Общая стоимость строительства составила 8,1 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5,9 млн рублей. Подрядная организация - ООО «Модуль 54». Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 26.06.2019 № RU22558308-12-2019.



15. Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта, по адресу: Павловский район, с. Жуковка, ул. Октябрьская, д. 22а

Общая стоимость строительства составила 7,3 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5,0 млн рублей. Подрядная организация - ООО «СИБПРО». Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.11.2019 № 22-RU22531309-16-2019.



16. Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта, по адресу: г. Барнаул, п. Березовка, ул. Центральная, д. 7а

Общая стоимость строительства составила 6,4 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5,0 млн рублей. Подрядная организация - ООО «СИБПРО». Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.11.2019 № 22-RU22302000-121-2019.



**17. Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта,
расположенного по адресу: г. Барнаул, п. Новомихайловка, ул.
Центральная, д. 27а**

Общая стоимость строительства составила 8,6 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 5,4 млн. рублей.

Подрядчик - ООО «Эксперт». Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.11.2019 № 22-RU22302000-120-2019.



**18. Капитальный ремонт инфекционного корпуса КГБУЗ
«Центральная городская больница, г. Бийск», расположенного по
адресу: ул. Садовая, 210**

Общая стоимость работ по капитальному ремонту инфекционного корпуса больницы, начатых в 2018 году, составила 38,2 млн рублей.

Подрядная организация - ООО «ПКФ «ОТДЕЛСТРОЙ».

В ходе проведения капитального ремонта выполнены работы по замене оконных и дверных блоков, отоплению и канализации. Проведены ремонтные работы кровли, крыльца, отмостки. Выполнены работы по внутренней отделке помещений.



19. Капитальный ремонт здания КГБУЗ «Алтайский онкологический диспансер», расположенного по адресу: ул. Матросова, д. 115, под КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул»

Общая стоимость работ по капитальному ремонту, начатых в 2018 году, составила 83,4 млн рублей. Подрядная организация - ООО «Спецстройинжиниринг».

Выполнены кровельные работы, заменены оконные блоки. Проведены работы по усилению простенков и плит перекрытия, устройству перегородок, полов, вентиляции, электромонтажные, штукатурные работы и отделочные работы, работы по устройству вентилируемого фасада и гидроизоляции стен подвала.



**20. Капитальный ремонт зданий больничного комплекса КГБУЗ
«Краснощековская центральная районная больница»**

Общая стоимость работ по капитальному ремонту 1 этапа (выборочный капитальный ремонт здания терапии, хирургии без перепланировки), начатого в 2018 году, составила 48,0 млн рублей. Подрядная организация - ООО «КОМПАС».

В ходе проведенного капитального ремонта выполнены работы по усилению проемов, замене дверных блоков, монтажу систем отопления, водоотведения и водоснабжения, устройству полов, монтажу внутренних электрических сетей и вентиляции. Проведены внутренние отделочные работы 1-го и 2-го этажей, устройство пандуса входной группы, переустройство отмостки, переустройство световых прямков.

Выполнены работы по переустройству линий электроснабжения и сигнализации.



2019-12-4 11:35

**21. Капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Кулундинская
центральная районная больница»**

Общая стоимость работ по капитальному ремонту конструктивных элементов здания и замене инженерных сетей составила 29,1 млн рублей. Подрядная организация - ООО «МильСтрой-Сибирика».

В ходе проведенного капитального ремонта выполнены работы по теплоизоляции кровли, устройству и теплоизоляции фасада, монтажу внутренних инженерных сетей (помещение прачечной), усилению стен и проемов. Проведена кирпичная кладка перегородок подвала, выполнен ремонт наружной версты, отопления и отделочные работы.



22. Капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Курьинская центральная районная больница»

Общая стоимость работ по капитальному ремонту, начатого в 2017 году, составила 70,4 млн рублей. Подрядная организация - ООО «Райагропромстрой». В ходе проведения капитального ремонта произведено усиление кирпичных стен 1-2 этажей и подвала, монтаж теплового узла, отопления. Произведена замена электросети на 1-2 этажах и подвале, устройство полов, системы вентиляции, устройство шахты лифта, облицовка потолков, замена дверных блоков, устройство входной площадки (станция «скорой помощи»), монтаж пожарной лестницы поликлиники, монтаж световых приемков стационара, наружных сетей канализации. Выполнены отделочные работы.




23. Капитальный ремонт больничного комплекса КГБУЗ «Целинная центральная районная больница»

Общая стоимость работ по капитальному ремонту объекта, начатого в 2017 году, составила 59,2 млн рублей. В 2017-2018 года работы проводились ООО «Акмилайт». В рамках государственного контракта было выполнено и оплачено работ на сумму 23,3 млн руб.

Были выполнены работы по замене кровли дневного стационара и детского отделения, устройству отмостки, замене окон. Произведен ремонт системы канализации, водоснабжения, электрических сетей. Выполнены отделочные работы.

В 2019 году работы по капитальному ремонту проводились ООО «АлтайСтрой-Фасад». В рамках государственного контракта было выполнено и оплачено работ на сумму 35,1 млн рублей.

В ходе проведения капитального ремонта выполнены работы по усилению стен и утеплению фасада, устройству разводки водопровода и канализации, устройству перегородок, устройству карниза, утеплению крыши, устройству крылец и потолков, устройству вентиляции. Выполнены отделочные работы.

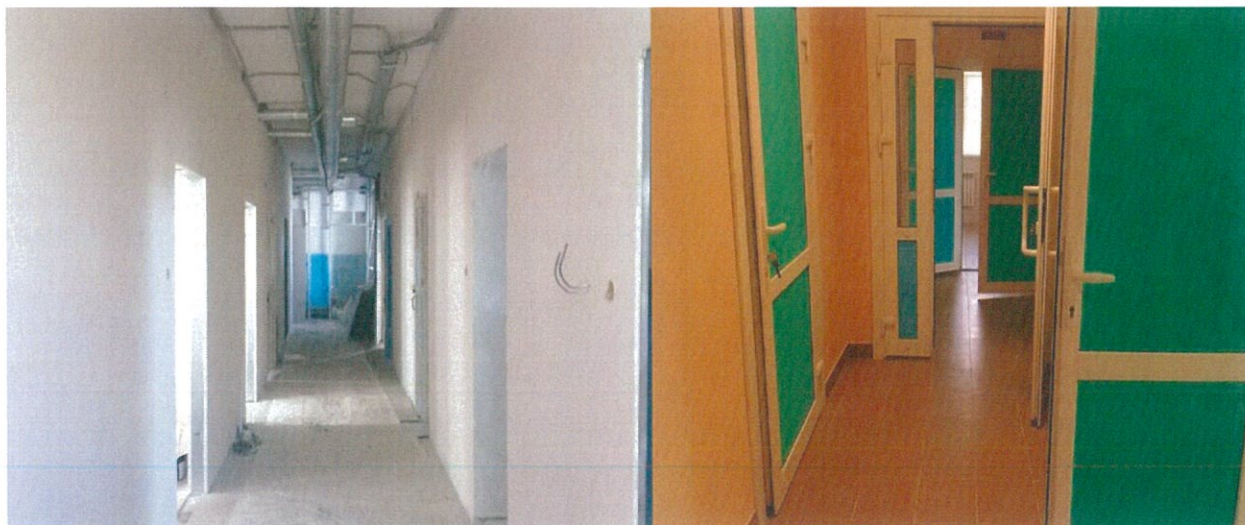

24. Капитальный ремонт главного корпуса КГБУЗ «Павловская центральная районная больница», расположенного по адресу: ул. Кунгурова, д. 1

Общая стоимость капитального ремонта главного корпуса больницы составила 15,7 млн руб. Подрядная организация - ООО СК «РемСтройРегион».

В ходе проведенного капитального ремонта выполнены работы по замене электропроводки, замене сетей водо и теплоснабжения, устройство системы вентиляции, устройство полов, кирпичная кладка перегородок. Проведены штукатурные и отделочные работы.



25. Реконструкция здания КГКУЗ «Краевая туберкулезная больница № 1», расположенного по адресу: ул. Белоярская, д. 1, под КГБУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер»

Подрядная организация - ООО «СЕЛФ». Государственный контракт от 08.11.2017 № Ф.2017.466096 на сумму 928,08 млн рублей. В рамках исполнения контракта принято и оплачено работ на сумму 268,1 млн рублей, в том числе в 2019 году – 252,9 млн рублей, из них за счет средств

федерального бюджета – 80,0 млн рублей, краевого бюджета 172,9 млн рублей.

В 2019 году проведены работы по выполнению обмерных работ и обследованию строительных конструкций, инженерных сетей блока лечебной диагностики, операционного отделения, завершена корректировка проектной и рабочей документации.

Ведутся работы по реконструкции пищеблока, прачечной, морга и проходной № 1. В блоках 1А и 1Б проведены демонтажные работы.




26. Строительство здания больничного комплекса КГБУЗ «Алтайская центральная районная больница»

На строительство поликлиники на 250 пос./смену с режимом работы в 1,5 смены заключен государственный контракт с ООО «Строй-Инвест» с ценой 181,7 млн рублей.

Срок выполнения работ 720 дней с момента заключения контракта, срок действия контракта до 20.12.2020.

В 2019 году произведены демонтажные работы здания поликлиники, проведены работы по разработке котлована и устройству нулевого цикла. Ведутся работы по кирпичной кладке стен и перекрытию 2-го этажа.

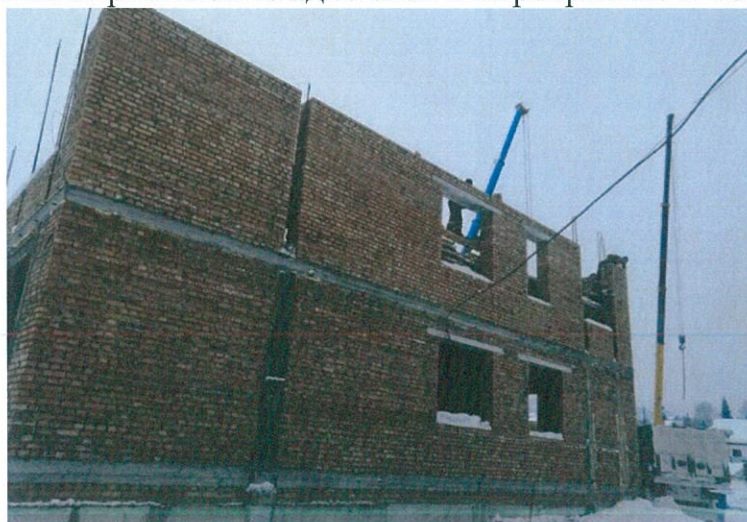

27. Капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Заринск»

Капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Заринск» будет осуществляться в несколько этапов.

На капитальный ремонт здания поликлиники (1 этап) в 2019 году заключен государственный контракт с ООО «Акмилайт» на сумму 68,1 млн рублей. Срок выполнения работ до 01.09.2020 года.

В 2019 году выполнены подготовительные и демонтажные работы, ведутся работы по ремонту кирпичной кладки фасада и устройству кровли.



28. Шелаболихинский район, с. Киприно, строительство офиса врачей общей практики

Для выполнения работ по строительству офиса врачей общей практики заключен государственный контракт с ООО «НСК» на сумму 19,2 млн рублей.

Выполнены работы в полном объеме: по монтажу наружных систем водоснабжения и канализации, наружных сетей электроснабжения и сетей связи, выполнена кладка наружных и внутренних стен, монтаж плит перекрытия, стяжка теплых полов, благоустройство.

Завершаются работы: по монтажу внутренних сетей канализации, утеплению и облицовке фасада, монтажу системы вентиляции, установки котельной, отделочные работы.



29. Реконструкция (пристройка перехода) КГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 7, г. Барнаул»

В 2020 году будут завершены работы по пристройке перехода КГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 7, г. Барнаул» в соответствии с заключенным контрактом с ООО «Алтайхимзащита» на сумму 28,5 млн рублей.

Выполнены работы в полном объеме: по монтажу наружных сетей водоотведения, устройству винтовых свай, устройству колонн, перекрытий 1-го и 2-го этажей, произведена кирпичная кладка стен 1-го и 2-го этажей;

Завершаются работы: по устройству центрального крыльца, устройству полов 1-го и 2-го этажей, устройству кровли и фасада, внутренней отделки.



7.3 Объекты отрасли «Культура»

На реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов отрасли «Культура» в 2019 году из средств краевого бюджета израсходовано 390,9 млн рублей.

1. Строительство здания КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка», расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Пушкина, д. 41

На выполнение строительно-монтажных заключен государственный контракт с ООО «СЕЛФ» от 22.12.2017 № Ф.2017.575896 на сумму 330,8 млн рублей.

Всего в рамках контракта принято и оплачено работ на сумму 293,5 млн рублей, в том числе в 2019 году - 186,8 млн рублей.



2. г. Барнаул, реконструкция здания КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края», расположенного по адресу: просп. Ленина, д. 88 / просп. Калинина, д. 1. Завершение реконструкции

На выполнение строительно-монтажных заключен государственный контракт с ООО «СЕЛФ» от 23.11.2018 № Ф.2018-02-133 на сумму 622,0 млн рублей.

Всего в рамках контракта принято и оплачено работ на сумму 180,1 млн рублей, в том числе в 2018 году - 1,8 млн рублей, в 2019 году - 178,3 млн рублей.

Работы должны быть закончены в срок не позднее 14.02.2021 года.



3. Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, строительство культурно-спортивного центра

Заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству от 22.12.2019 № Ф.2019.014766 с ООО «Аура» на сумму 169,1 млн рублей. Работы должны быть закончены в срок не позднее 01.12.2021 года.

4. г. Бийск, капитальный ремонт крыши здания КГБ ПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж», расположенного по адресу: ул. Льва Толстого, д. 152

Заключен государственный контракт от 27.03.2019 № Ф.2019.117171 с ООО «БЛОК» на выполнение работ по капитальному ремонту на сумму 7,1 млн рублей. Всего в рамках контракта в 2019 году принято и оплачено работ на сумму 5,1 млн рублей.

В 2019 году выполнены следующие виды работ: демонтажные работы; монтаж конструкций покрытия; огнебиозащита стропильной системы; устройство кровли, вентиляции, утеплителя; демонтаж кровельного пирога.

7.4 Объект отрасли «Соцобеспечение»

Строительство лечебно-административного корпуса с пристройкой бассейна и спортивного зала КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики», расположенного в г. Барнауле по ул. Тихонова, д. 68

Объект завершен в 4 квартале 2019 года. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.12.19 № 22-RU22302000-150-2019.

Подрядная организация - ООО «Спецстройинжиниринг». Финансирование объекта осуществлялось с участием средств Пенсионного фонда Российской Федерации.

Общая стоимость реконструкции, включая расходы на приобретение оборудования (8,4 млн рублей) и прочие затраты, составила 214,3 млн рублей, в том числе за счет средств Пенсионного фонда России -148,8 млн рублей, за счет средств краевого бюджета - 65,5 млн рублей.



7.5 Объект отрасли «Жилищное строительство»

Строительство жилого дома для работников краевых учреждений социальной сферы, расположенного по адресу: г.Барнаул, ул.Сизова, д.24

Строительство объекта завершено в 2019 году. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 23.08.2019 № 22-RU22302000-80-2019.

Подрядная организация - ООО «Строитель». Общая стоимость строительства, включая расходы на приобретение оборудования и прочие затраты, составила 249,2 млн рублей.



7.6 Объект отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Строительство наружных сетей центра медицинской реабилитации ортопедо-травматологического профиля (теплоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение)

Строительство объекта осуществлялось в три этапа: 1-й - строительство сетей тепло-и водоснабжения, 2-й - строительство сетей водоотведения, 3-й - строительство внутриплощадочных сетей.

Работы по первому и третьему этапам были проведены в 2018 году.

Строительство сетей водоотведения (2-й этап) завершено во 2 квартале 2019 года.

Подрядная организация - ООО «Строительно-монтажная компания «ВиКС». Общая стоимость строительства составила 12,8 млн рублей.



7.7 Прочие объекты

На реализацию мероприятий по отрасли «Прочие объекты» в 2019 году израсходовано 94,6 млн рублей.

7.7.1 Капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу: ул. Попова, д. 68

Реализация мероприятия предполагала выполнение капитального ремонта здания общей площадью почти 6000 кв. м., предназначенного для размещения Министерства юстиции Алтайского края по адресу: г. Барнаул, ул. Попова, 68.

Капитальный ремонт объекта завершен в 3 квартале 2019 года. Подрядная организация - ООО «Новострой».

Общая стоимость капитального ремонта, включая расходы на приобретение оборудования (13,2 млн рублей) и прочие затраты, составила 220,9 млн рублей.

В 2019 году выполнены следующие виды работ: общестроительные работы; внутренние инженерные сети; устройство лифтов; подготовительные работы по инженерным сетям (водопровод); наружные сети; вертикальная планировка, отделка вестибюля; устройство отмостки.



**7.7.2 Работы по сохранению объекта культурного наследия
«Магазин Трубицина», нач. XX в. Алтайский край, г. Барнаул, ул.
Пушкина, 48**

Заключен государственный контракт от 15.11.2018 № 18/297 на сумму 48,8 млн. рублей. Срок выполнения работ - 395 дней с даты получения разрешения на строительство. В 2019 году выполнено и оплачено работ на сумму 2,1 млн рублей.

**7.7.3 Капитальный ремонт здания молодежной политики
Алтайского края, расположенного по адресу: ул. М. Горького, д. 39.**

Контракт заключен 17.10.2019 № Ф.2019.010394 с ООО «РОСТ» на сумму 12,9 млн рублей. Работа должна быть закончена в срок не позднее 01.09.2020 года. В 2019 году выполнено и оплачено 0,99 млн рублей.

В 2019 году выполнены следующие виды работ: подготовительные работы; демонтажные работы; кирпичная кладка подвала (проемы); обрамление откосов; пробивка проемов; кладка перегородок.

Работы должны быть закончены в срок не позднее 01.09.2020 года.

8. Перспективы работы на 2020 год

В целях реализации краевой адресной инвестиционной программы на 2020 год, утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 24.12.2019 № 535, КГКУ «Единый стройзаказчик» определено государственным заказчиком в отношении 55 объектов капитального строительства, в том числе: образования – 23, здравоохранения – 18, культуры – 7, физической культуры и спорта – 5, соцобеспечения – 1, прочих – 1.

Распоряжением Правительства Алтайского края от 24.12.2019 № 473-р о распределении средств краевого бюджета на выполнение мероприятий по капитальному ремонту социально-значимых объектов учреждение определено государственным заказчиком в отношении 3 объектов, в том числе: здравоохранения - 1, прочих - 2. Кроме того, учреждение выполняет функции государственного заказчика по 9 объектам, которые не вошли в указанные нормативно-правовые акты.

На реализацию данных мероприятий предусмотрен объем бюджетных ассигнований в сумме 3 489,0 млн рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 2 541,4 млн рублей, за счет средств федерального бюджета – 947,6 млн рублей.
